ᲨᲞᲡ GEO AGRO ESTATE · მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა

სამუშაო გეგმა-გრაფიკი

2 ნოე. 2026 – 28 თებ. 2027 · დირექტორი: ლაშა შალამბერიძე

სამუშაო ვერსია · მფლობელებთან შესათანხმებლად

რა არის ეს დოკუმენტი

კომპანიის სამუშაო გეგმა ნოემბრიდან სეზონის დაწყებამდე: რა უნდა გაკეთდეს, როდის და ვინ არის პასუხისმგებელი. მიზანია, რომ მოსავლის აღებისთვის კომპანიას ჰქონდეს გაწვრთნილი გუნდი, მოწესრიგებული პლანტაცია და მზა ინფრასტრუქტურა.

ფინანსები და ფასები ცალკე შეთანხმდება მფლობელებთან. ინვენტარის ბიუჯეტის ცხრილი ბოლოშია და ფასების გარკვევისას შეივსება.

ეტაპები

ეტაპი 1

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

დაკომპლექტებული, გაწვრთნილი და ფორმიანი გუნდი; ბალახისგან გაწმენდილი რიგები.

ეტაპი 2

დეკემბერი 2026

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხლული პლანტაცია; შერჩეული კომპანიები, ფასები და ინვენტარის ბიუჯეტი.

ეტაპი 3

იანვარი 2027

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

სადგომი, კარავი, სანიტარული კვანძი, საწყობი და ესტაკადა მშენებლობის პროცესში.

ეტაპი 4

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მოწვეული მკრეფავები, ნაჩვენები ინფრასტრუქტურა, გადამოწმებული სიები.

მიმდინარე მდგომარეობა

ამოცანები
14


დასრულებული / მიმდინარე
0 / 0

ვადაგადაცილებული
0

საერთო პროგრესი
0%

გრაფიკი

დროის ხაზი კვირების მიხედვით (რიცხვი = კვირის დასაწყისი, ორშაბათი).

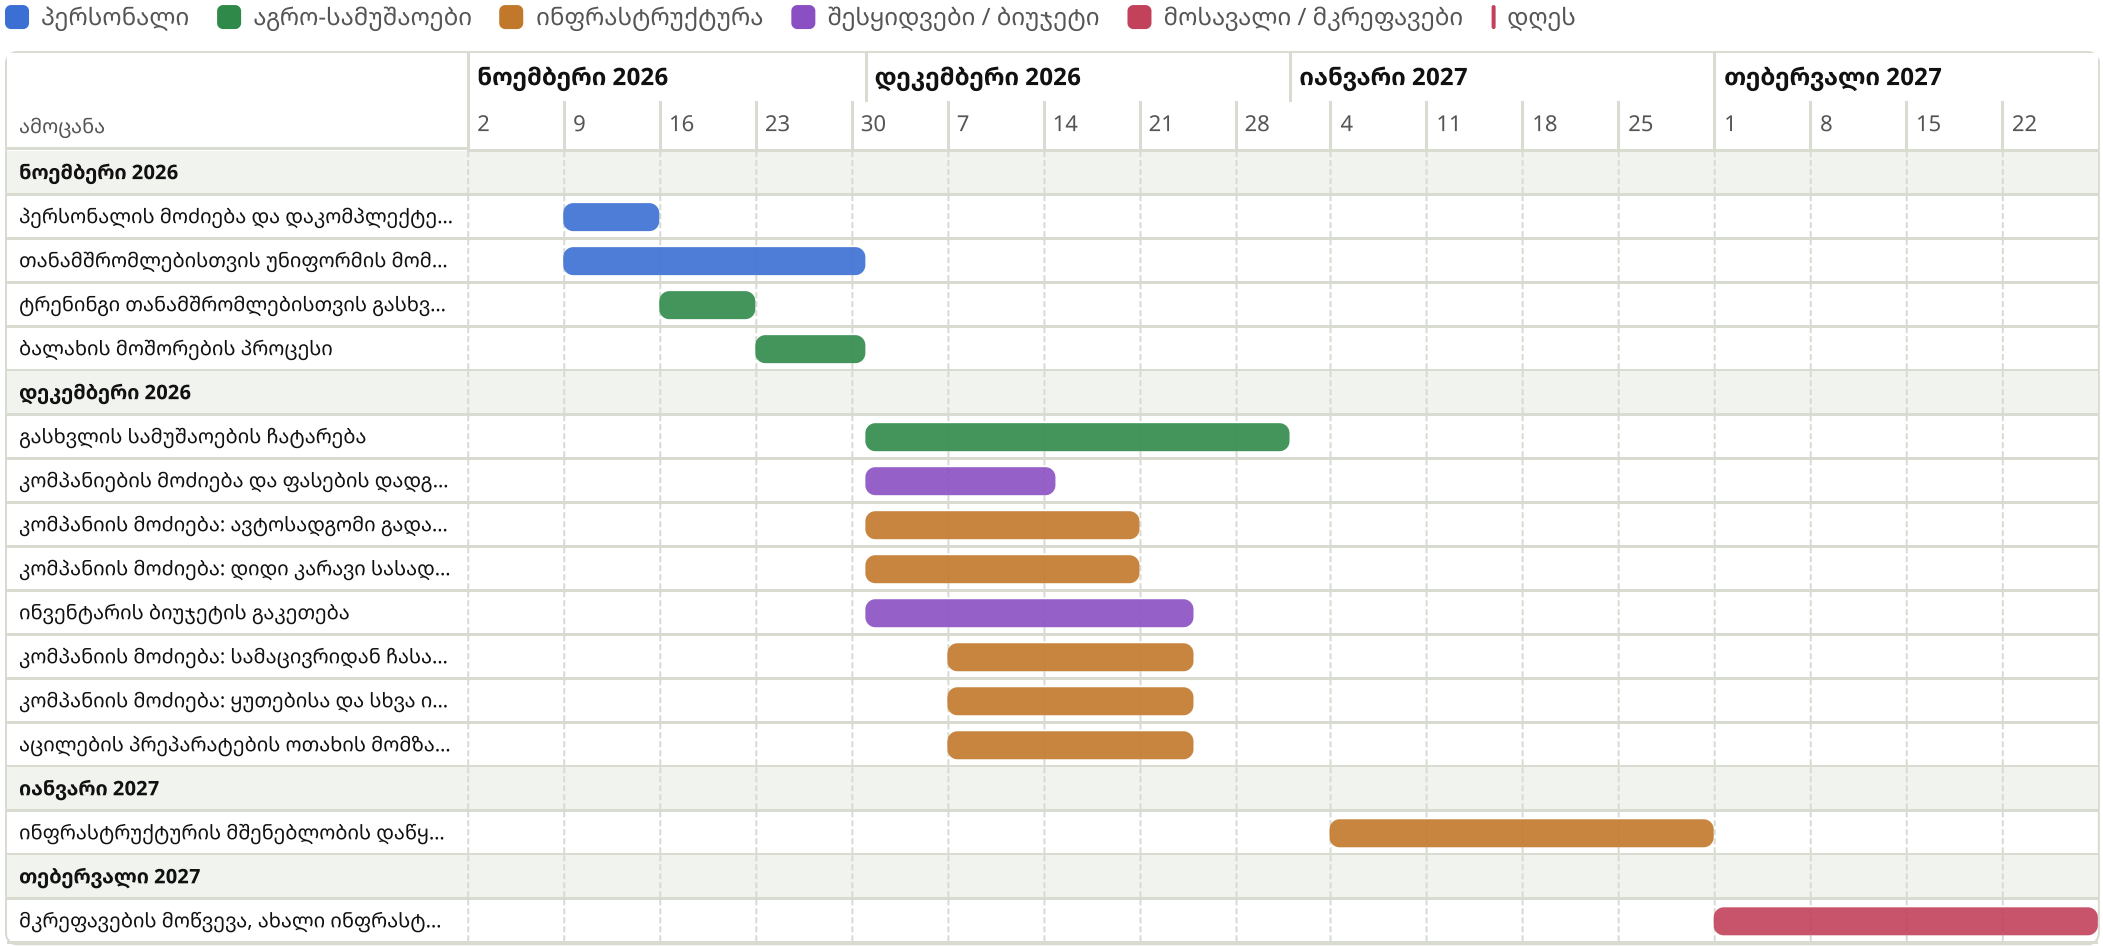

ამოცანები თვეების მიხედვით

თითო ამოცანას აქვს ვადა, პასუხისმგებელი, მიზანი („რატომ“) და შესასრულებელი ქვეპუნქტები.

ნოემბერი 2026 გუნდის შეკრება და მომზადება

4 ამოცანა · 0%

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება არ დაწყებულა

📅 9 ნოე. – 15 ნოე. პერსონალი 👤 დირექტორი ✔ 0/5

რატომ: სეზონის ყველა სამუშაოს საფუძველი: საჭირო რაოდენობის სანდო ხალხი.

ნოემბრის მე-2 კვირა

- [ ] საჭირო პოზიციების და რაოდენობის განსაზღვრა
- [ ] ვაკანსიის გავრცელება
- [ ] გასაუბრებები
- [ ] შერჩეულ კანდიდატებთან ხელშეკრულებები
- [ ] სიის შედგენა (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება არ დაწყებულა

📅 9 ნოე. – 30 ნოე. პერსონალი ✔ 0/4

რატომ: ერთიანი, ლამაზი ვიზუალი და უსაფრთხოება. თანამშრომლები ადვილად ამოსაცნობები არიან.

- [ ] ზომების შეგროვება
- [ ] მომწოდებლის შერჩევა
- [ ] ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება
- [ ] შეკვეთა და დარიგება

ტრენინგი თანამშრომლებისთვის გასხვლაზე არ დაწყებულა

📅 16 ნოე. – 22 ნოე. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი ✔ 0/4

რატომ: სწორი გასხვლა პირდაპირ განსაზღვრავს მომავალი მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხს.

ნოემბრის მე-3 კვირა

- [ ] გასხვლის წესები მოცვზე (თეორია)
- [ ] პრაქტიკა ნაკვეთზე
- [ ] სეკატორების გამოყენება და დეზინფექცია
- [ ] უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ბალახის მოშორების პროცესი არ დაწყებულა

📅 23 ნოე. – 30 ნოე. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი

რატომ: სუფთა რიგები: ადვილი გასხვლა და ნაკლები კონკურენცია მცენარისთვის.

ნოემბრის მე-4 კვირა

დეკემბერი 2026 გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

8 ამოცანა · 0%

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება

არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 31 დეკ. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი

რატომ: ზამთრის გასხვლა უნდა დასრულდეს კვირტების გაღვიძებამდე.

დეკემბრის ბოლომდე

კომპანიების მოძიება და ფასების დადგენა: ფორმები, ტუალეტები, აბაზანა/საშხაპე, შესანახი ლოკერები

არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 14 დეკ. შესყიდვები / ბიუჯეტი ✔ 0/6

რატომ: მშენებლობამდე ვიცით ზუსტი ფასები და ვირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას.

- [ ] ფორმები (უნიფორმა)
- [ ] აბაზანა / საშხაპე / ხელსაბანი
- [ ] კომპანიების ნახვა ადგილზე
- [ ] ბიოტუალეტები
- [ ] შესანახი ლოკერები
- [ ] ფასების შედარების ცხრილი

კომპანიის მოძიება: ავტოსადგომი გადახურვით + Kärcher სამრეცხაო

არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 20 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/4

რატომ: ტექნიკა და ავტომობილები დაცულია ამინდისგან, რეცხვა კი ერთ ადგილას ხდება.

- [ ] სადგომის ზომა და ადგილი
- [ ] Kärcher სამრეცხაოს წერტილი (წყალი, დრენაჟი, დენი)
- [ ] 3 კომპანიის შეთავაზება
- [ ] გადახურვის ტიპი

კომპანიის მოძიება: დიდი კარავი სასადილოსა და დასასვენებლად, ინფრასტრუქტურით

არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 20 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/5

რატომ: მკრეფავებს აქვთ ჩრდილი, კვება და დასასვენებელი ადგილი: ნაკლები დაღლა, მეტი პროდუქტიულობა.

- [ ] კარვის ზომა მკრეფავების რაოდენობაზე
- [ ] მაგიდები და სკამები
- [ ] საკვების ზონა
- [ ] ვენტილატორები / განათება / დენი
- [ ] 3 კომპანიის შეთავაზება

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება

არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 24 დეკ. შესყიდვები / ბიუჯეტი 👤 დირექტორი ✔ 0/6

რატომ: მფლობელებთან შესათანხმებლად: რა უნდა ვიყიდოთ, რამდენი და რა ღირს.

დეტალები: ქვემოთ, ინვენტარის ბიუჯეტის ცხრილში

- [ ] სასწორები
- [ ] კომპიუტერები
- [ ] გენერატორები
- [ ] სეკატორები (ფანცატურები)
- [ ] სამედიცინო ურნები
- [ ] ავეჯი

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა)

არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/3

რატომ: პროდუქციის უსაფრთხო და სწრაფი ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა სამაცივრესთან.

- [ ] გაზომვები
- [ ] ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- [ ] შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი

არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/3

რატომ: ყუთები და ინვენტარი მოწესრიგებულია და ყოველთვის ხელმისაწვდომია.

შესაძლებელია ერთ გადახურვაში გაკეთდეს პრეპარატების ოთახთან ერთად

- [ ] ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- [ ] თაროები / სტელაჟები
- [ ] შეთავაზებები

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/8

რატომ: ქიმიური პრეპარატები ინახება უსაფრთხოების წესების დაცვით: დაცულია ხალხიც და პროდუქციაც.

შესაძლებელია ერთ გადახურვაში გაკეთდეს საწყობთან ერთად

- [ ] ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- [ ] ცეცხლმაქრი
- [ ] გამაფრთხილებელი ნიშნები და წესების დაფა
- [ ] ვენტილაცია
- [ ] დაცვის საშუალებები (ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე)
- [ ] პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი
- [ ] თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- [ ] ხელსაბანი / თვალის სარეცხი

იანვარი 2027 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

1 ამოცანა · 0%

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყება

არ დაწყებულა

📅 4 იან. – 31 იან. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/7

რატომ: ყველა ობიექტი მზად უნდა იყოს სეზონის დაწყებამდე.

- [ ] ავტოსადგომი გადახურვით + სამრეცხაო
- [ ] სასადილო / დასასვენებელი კარავი
- [ ] ტუალეტები, აბაზანა, ხელსაბანი
- [ ] ლოკერები
- [ ] სამაცივრის ესტაკადა
- [ ] ყუთების საწყობი + პრეპარატების ოთახი
- [ ] ინვენტარის შეძენა ბიუჯეტის მიხედვით

თებერვალი 2027 მკრეფავების მომზადება

1 ამოცანა · 0%

მკრეფავების მოწვევა, ახალი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და სიების გავლა

არ დაწყებულა

📅 1 თებ. – 28 თებ. მოსავალი / მკრეფავები ✔ 0/3

რატომ: მკრეფავები ეცნობიან ახალ პირობებს, ჩვენ ვადასტურებთ, ვინ მუშაობს სეზონზე.

- [ ] მკრეფავების მოწვევა
- [ ] ინფრასტრუქტურის დათვალიერება
- [ ] სიების გადამოწმება

ინვენტარის ბიუჯეტი

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ერთ. ფასი (₾)	ჯამი (₾)
სასწორები				—
სეკატორები (ფანცატურები)				—
კომპიუტერები				—
სამედიცინო ურნები				—
გენერატორები				—
ავეჯი				—
სულ				**—**

Geo Agro Estate · აღრიცხვა: AgroInTechSol (agrointechsol.ge)
