შპს GEO AGRO ESTATE · მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა

სამუშაო გეგმა ნოემბერი 2026 – თებერვალი 2027

გუნდი, პლანტაციის მოვლა, ინფრასტრუქტურა და მომზადება სეზონისთვის



წარმოადგენს: ლაშა შალამბერიძე, დირექტორი · 28.10.2026

სამუშაო ვერსია მფლობელებთან შესათანხმებლად

მიზანი

სეზონის დაწყებისთვის კომპანიას უნდა ჰქონდეს გაწვრთნილი გუნდი, მოწესრიგებული პლანტაცია და მზა ინფრასტრუქტურა მკრეფავებისთვის, ტექნიკისთვის და პროდუქციისთვის.

1

გუნდი

დაკომპლექტებული პერსონალი, გასხვლის ტრენინგი, ერთიანი უნიფორმა, უსაფრთხოების წესები.

2

პლანტაცია

ბალახის მოშორება და ზამთრის გასხვლა დეკემბრის ბოლომდე. ეს განსაზღვრავს მომავალ მოსავალს.

3

ინფრასტრუქტურა

სადგომი, სამრეცხაო, კარავი, სანიტარული კვანძი, საწყობი, პრეპარატების ოთახი, ესტაკადა.

500 მკრეფავი მაქსიმუმ

5 + 5 ავტომობილი და ტრაქტორი

4 თვე სეზონამდე

AgroInTechSol აღრიცხვა: QR, სასწორი, რეპორტები

ეტაპები

ოთხი თვე, ოთხი ეტაპი. მარტი და აპრილი (აყვავება, მოსავლის მზადება) შემდეგ ეტაპზე დაემატება.

ეტაპი 1

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

დაკომპლექტებული, გაწვრთნილი და ფორმიანი გუნდი; ბალახისგან გაწმენდილი რიგები.

4 ამოცანა

ეტაპი 2

დეკემბერი 2026

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხლული პლანტაცია; შერჩეული კომპანიები, ფასები და ინვენტარის ბიუჯეტი.

9 ამოცანა

ეტაპი 3

იანვარი 2027

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

სადგომი, კარავი, სანიტარული კვანძი, საწყობი და ესტაკადა მშენებლობის პროცესში.

1 ამოცანა

ეტაპი 4

თებერვალი 2027


მკრეფავების მომზადება

მოწვეული მკრეფავები, ნაჩვენები ინფრასტრუქტურა, გადამოწმებული სიები, მუშების უსაფრთხოება.

2 ამოცანა

გრაფიკი

ყველა ამოცანა კვირების მიხედვით. ფერი = კატეგორია.

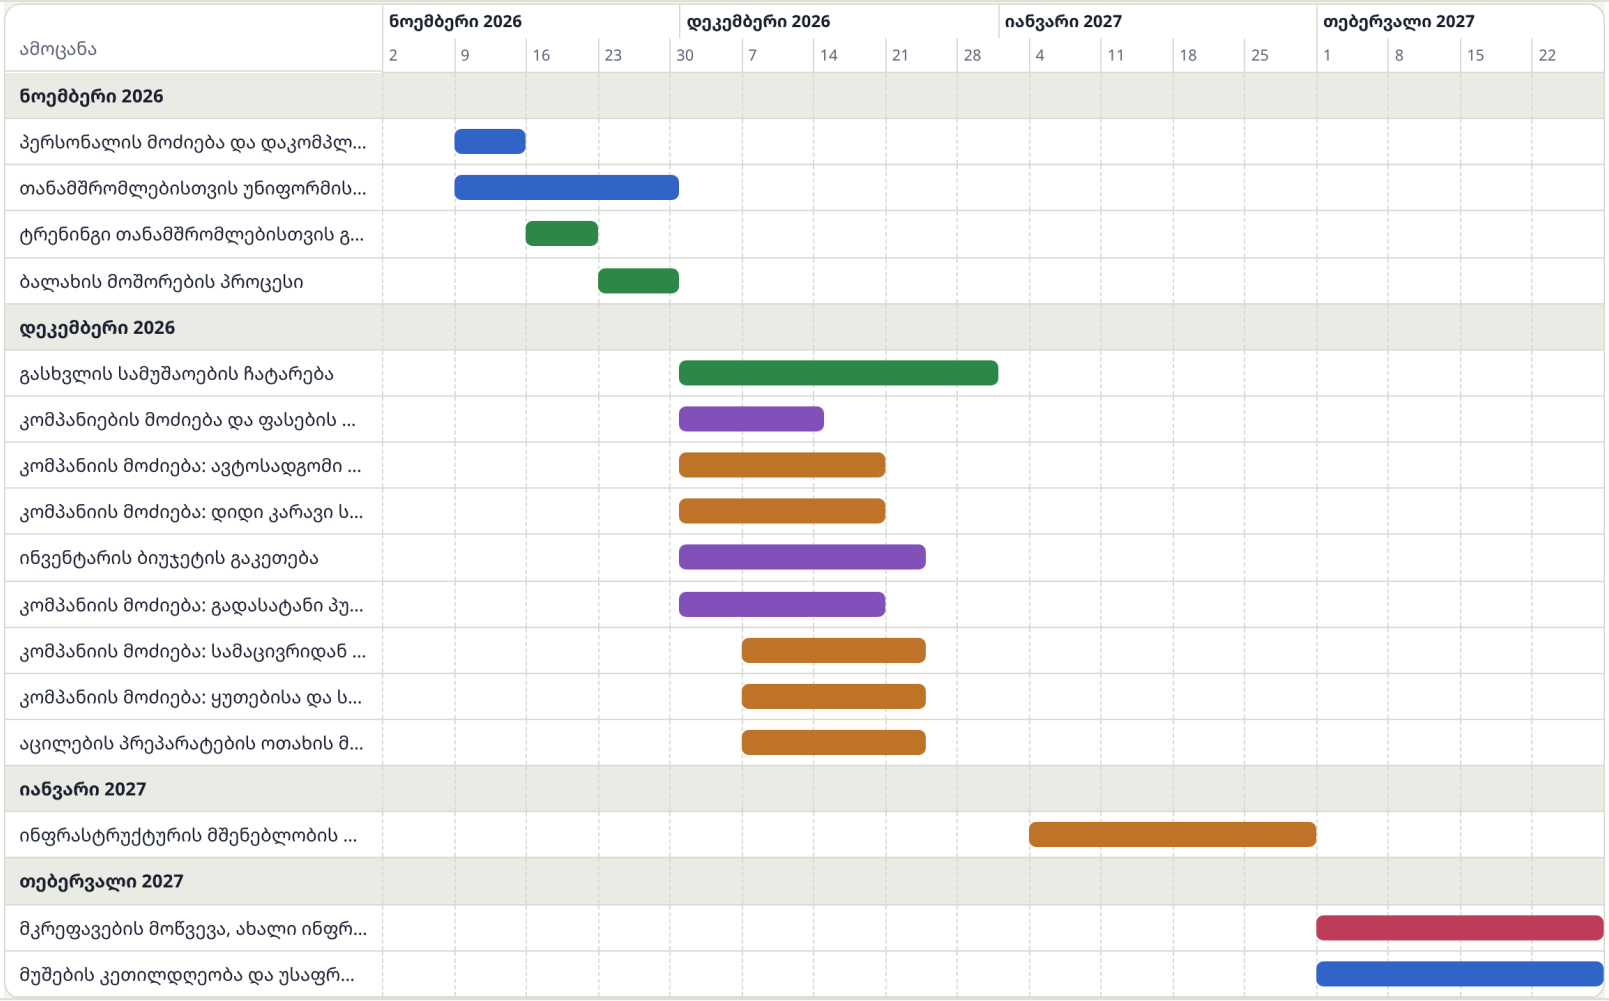

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება

9 ნოემბ. – 15 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: დირექტორი

სეზონის ყველა სამუშაოს საფუძველი: საჭირო რაოდენობის სანდო ხალხი.

- საჭირო პოზიციების და რაოდენობის განსაზღვრა
- ვაკანსიის გავრცელება
- გასაუბრებები
- შერჩეულ კანდიდატებთან ხელშეკრულებები
- სიის შედგენა (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება

9 ნოემბ. – 30 ნოემბ.

პერსონალი

ერთიანი, ლამაზი ვიზუალი და უსაფრთხოება. თანამშრომლები ადვილად ამოსაცნობები არიან.

- ზომების შეგროვება
- ზაფხულის მაისური (მოკლე სახელო, თეთრი)
- ზამთრის მაისური (გრძელი სახელო, მოცვისფერი)
- ქურთუკი (წყალგაუმტარი, ამრეკლი ზოლებით)
- მომწოდებლის შერჩევა
- ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება

+ კიდევ 1

ტრენინგი თანამშრომლებისთვის გასხვლაზე

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

სწორი გასხვლა პირდაპირ განსაზღვრავს მომავალი მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხს.

- გასხვლის წესები მოცვზე (თეორია)
- პრაქტიკა ნაკვეთზე
- სეკატორების გამოყენება და დეზინფექცია
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ბალახის მოშორების პროცესი

23 ნოემბ. – 30 ნოემბ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

სუფთა რიგები: ადვილი გასხვლა და ნაკლები კონკურენცია მცენარისთვის.

დეკემბერი 2026: გასხვლა და შესყიდვები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება

1 დეკ. – 31 დეკ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

ზამთრის გასხვლა უნდა დასრულდეს კვირტების გაღვიძებამდე.

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება

1 დეკ. – 24 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი · პასუხისმგებელი: დირექტორი

მფლობელებთან შესათანხმებლად: რა უნდა ვიყიდოთ, რამდენი და რა ღირს.

- სასწორები
- სეკატორები (ფანცატურები)
- კომპიუტერები
- სამედიცინო ურნები
- გენერატორები
- ავეჯი

+ კიდევ 1

კომპანიების მოძიება და ფასების დადგენა: ფორმები, ტუალეტები, აბაზანა/საშხაპე, შესანახი ლოკერები

1 დეკ. – 14 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

მშენებლობამდე ვიცით ზუსტი ფასები და ვირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას.

- ფორმები (უნიფორმა)
- ბიოტუალეტები
- აბაზანა / საშხაპე / ხელსაბანი
- შესანახი ლოკერები
- კომპანიების ნახვა ადგილზე
- ფასების შედარების ცხრილი

კომპანიის მოძიება: გადასატანი პუნქტები სეკატორების (ფანცატურების) გაცემა-აღრიცხვისთვის (მინ. 5)

1 დეკ. – 20 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

ყველა სეკატორი აღრიცხულია: ვინ აიღო და დააბრუნა. ხელსაწყო არ იკარგება და დასახლოება რჩება მუშავებს ახლოს.

- გადასატანი ჯიხური ან ურიკა სახურავით (მზისა და წვიმისგან)
- სავარძელი და მაგიდა აღრიცხველისთვის
- ჩასაკეტი ყუთი სეკატორებისთვის (ნომერირებული ბუდეები)
- ტაბლეტი ან ტელეფონი: გაცემა-დაბრუნება QR-ით AgroInTechSol-ში
- სეკატორების დეზინფექციის ჭურჭელი და სალუსი
- მინიმუმ 5 პუნქტი, 3 კომპანიის შეთავაზება

დეკემბერი 2026: ინფრასტრუქტურის კომპანიები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

კომპანიის მოძიება: ავტოსადგომი გადახურვით + Kärcher სამრეცხაო

1 დეკ. – 20 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- სადგომის ზომა და ადგილი
- გადახურვის ტიპი
- Kärcher სამრეცხაოს წერტილი (წყალი, დრენაჟი, დენი)
- 3 კომპანიის შეთავაზება

კომპანიის მოძიება: დიდი კარავი სასადილოსა და დასასვენებლად, ინფრასტრუქტურით

1 დეკ. – 20 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- კარვის ზომა მკრეფავების რაოდენობაზე
- მაგიდები და სკამები
- ვენტილატორები / განათება / დენი
- საკვების ზონა

+ კიდევ 1

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა)

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- გაზომვები
- ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- თაროები / სტელაჟები
- შეთავაზებები

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- ვენტილაცია
- თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- ცეცხლმაქრი

+ კიდევ 4

იანვარი 2027

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყება

4 იანვ. – 31 იანვ.

ინფრასტრუქტურა

ყველა ობიექტი მზად უნდა იყოს სეზონის დაწყებამდე.

- ავტოსადგომი გადახურვით + სამრეცხაო
- სასადილო / დასასვენებელი კარავი
- ტუალეტები, აბაზანა, ხელსაბანი
- ლოკერები
- სამაცივრის ესტაკადა
- ყუთების საწყობი + პრეპარატების ოთახი

+ კიდევ 1

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მკრეფავების მოწვევა, ახალი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და სიების გავლა

1 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები

მკრეფავები ეცნობიან ახალ პირობებს, ჩვენ ვადასტურებთ, ვინ მუშაობს სეზონზე.

- მკრეფავების მოწვევა
- ინფრასტრუქტურის დათვალიერება
- სიების გადამოწმება

მუშების კეთილდღეობა და უსაფრთხოება

1 თებ. – 28 თებ.

პერსონალი


კმაყოფილი და დაცული მუშა უკეთ კრეფს და ბრუნდება შემდეგ სეზონზეც.

- სიცხის გეგმა: წყალი, ჩრდილი, შესვენებების გრაფიკი
- სასმელი წყლის წერტილები სექტორებში
- პირველადი დახმარების ყუთები (თითო ბრიგადაზე)
- პირველადი დახმარების ტრენინგი ბრიგადირებისთვის
- საგანგებო ტელეფონები და უახლოესი სამედიცინო პუნქტი დაფაზე
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი ხელმოწერით ყველა თანამშრომლისთვის

+ კიდევ 2

ტერიტორია: განლაგება

განლაგება აღებულია ადგილის რუკიდან (მასშტაბით). ზომები სავარაუდოა და კომპანიებთან დაზუსტდება.

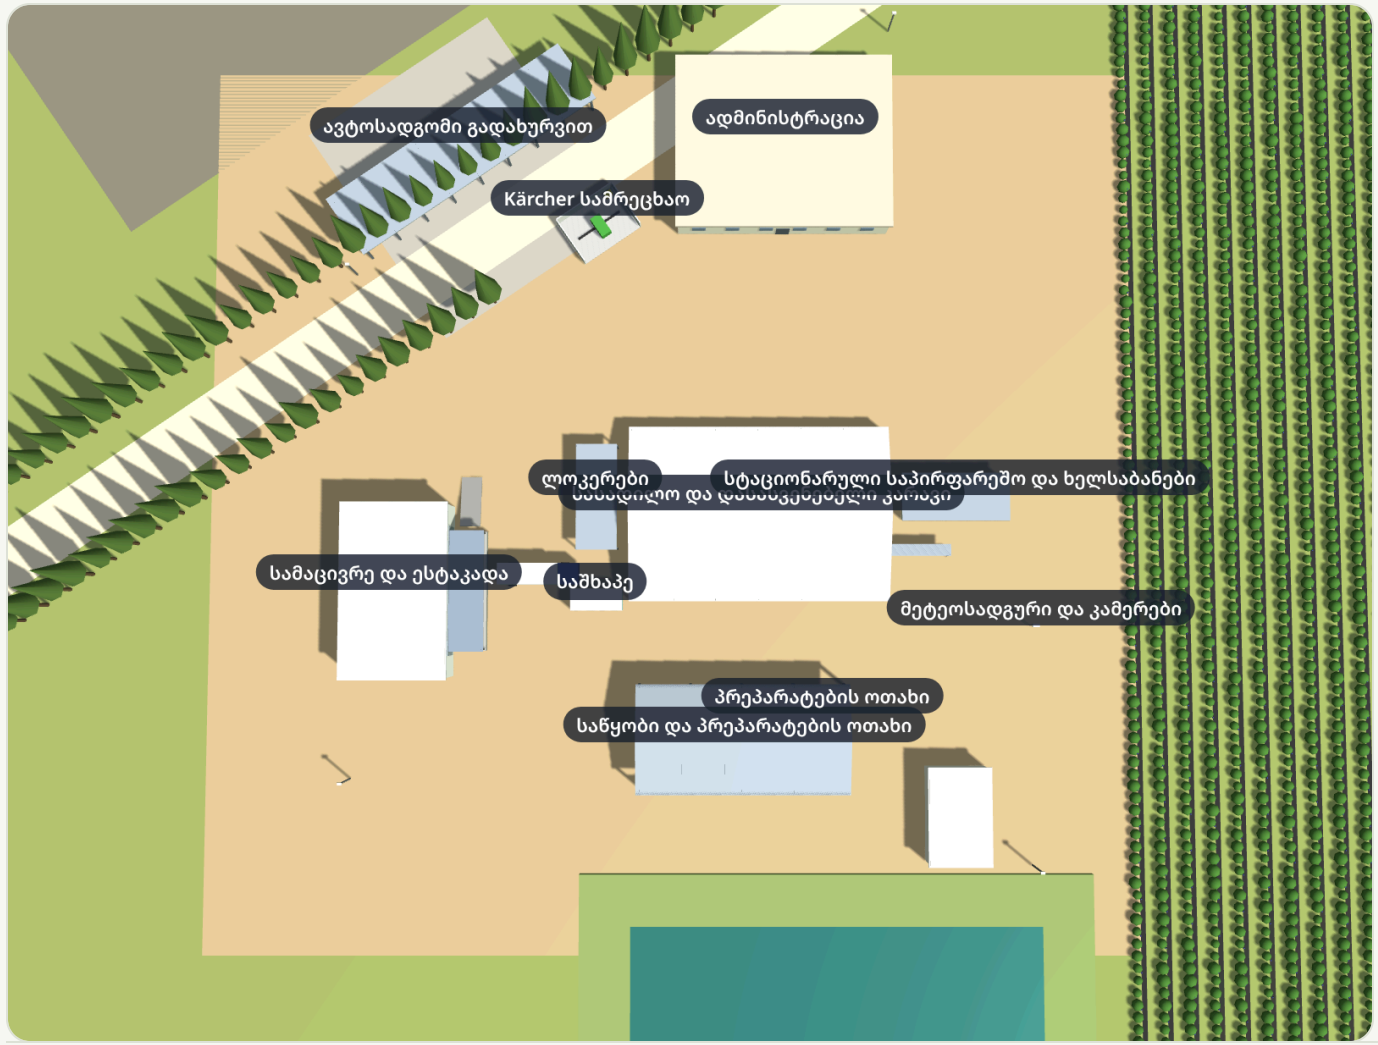

ადმინისტრაცია ჩრდილოეთით, გზიდან შესასვლელთან.

სადგომი და Kärcher-სამრეცხაო ხრეშიან ადგილზე, გზის გასწვრივ.

სამაცივრე (არსებული) ადმინისტრაციის სამხრეთ-დასავლეთით, ახალი ესტაკადით.


კარავი ეზოს შუაში, გვერდით ლოკერები, საშხაპე და სტაციონარული საპირფარეშო.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი ერთი გადახურვის ქვეშ, აუზის ზემოთ.

პლანტაცია აღმოსავლეთით.

ავტოსადგომი და სამრეცხაო

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 1–20 დეკემბერი, მშენებლობა იანვარში

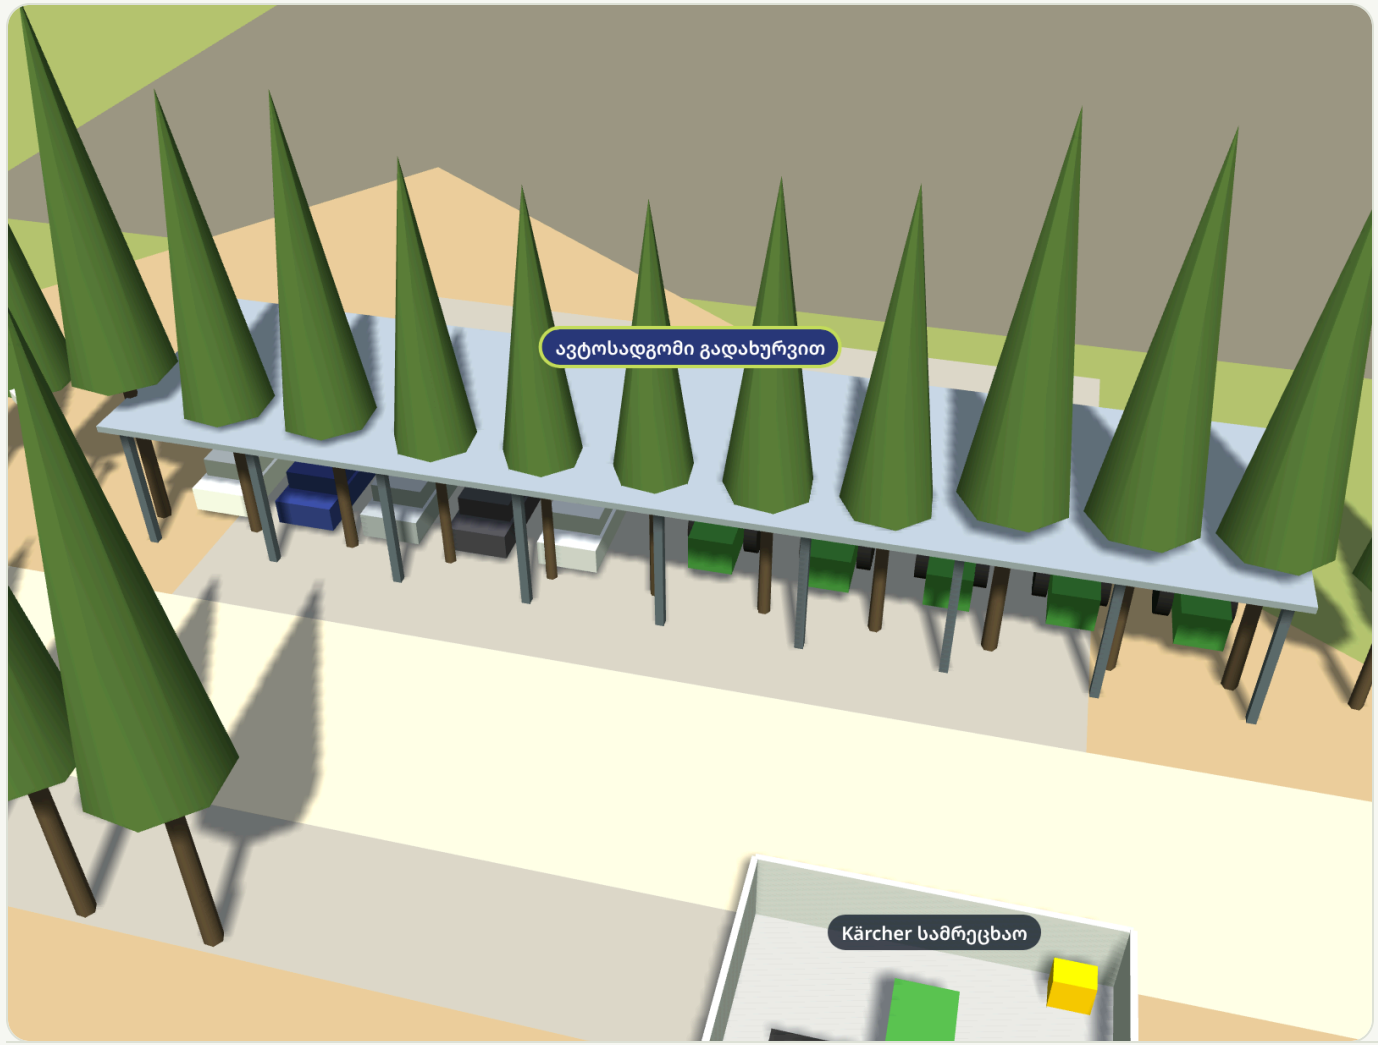

სადგომი ≈ 32 × 7 მ: 5 ავტომობილი და 5 ტრაქტორი, სიმაღლე ≈ 4.2 მ.


ლითონის კონსტრუქცია პროფნასტილის გადახურვით: დაცვა მზისგან, წვიმისა და სეტყვისგან.

Kärcher-სამრეცხაო ≈ 8 × 6 მ: ბეტონის ბაქანი დახრით, დრენაჟი და ზეთდამჭერი. საჭიროა წყალი და დენი 380V.

განათება, კამერა, ცეცხლმაქრი.

სამაცივრე და ესტაკადა

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 7–24 დეკემბერი

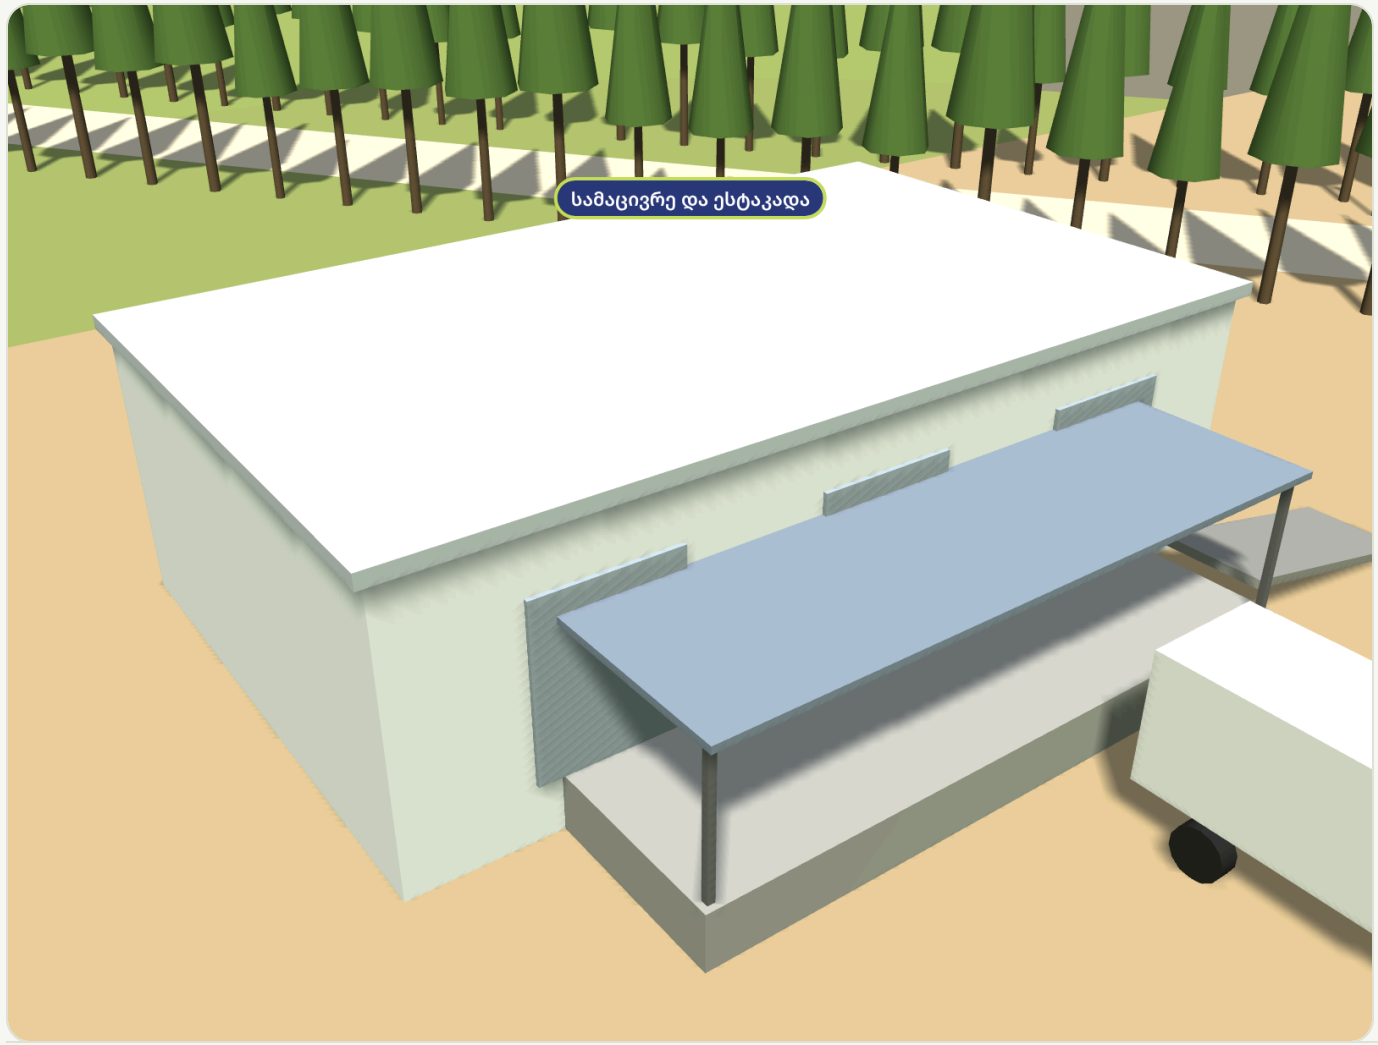

სამაცივრე უკვე დგას და მასში ინახება მოცვი.


ესტაკადა ≈ 12 × 4 მ: ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე (1.2 მ), სახურავით.

პანდუსი ურიკისთვის, რეზინის ბამპერები, მოაჯირი, განათება.

შედეგი: პროდუქცია სწრაფად და დაუზიანებლად გადადის.

სასადილო და დასასვენებელი კარავი

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 1–20 დეკემბერი

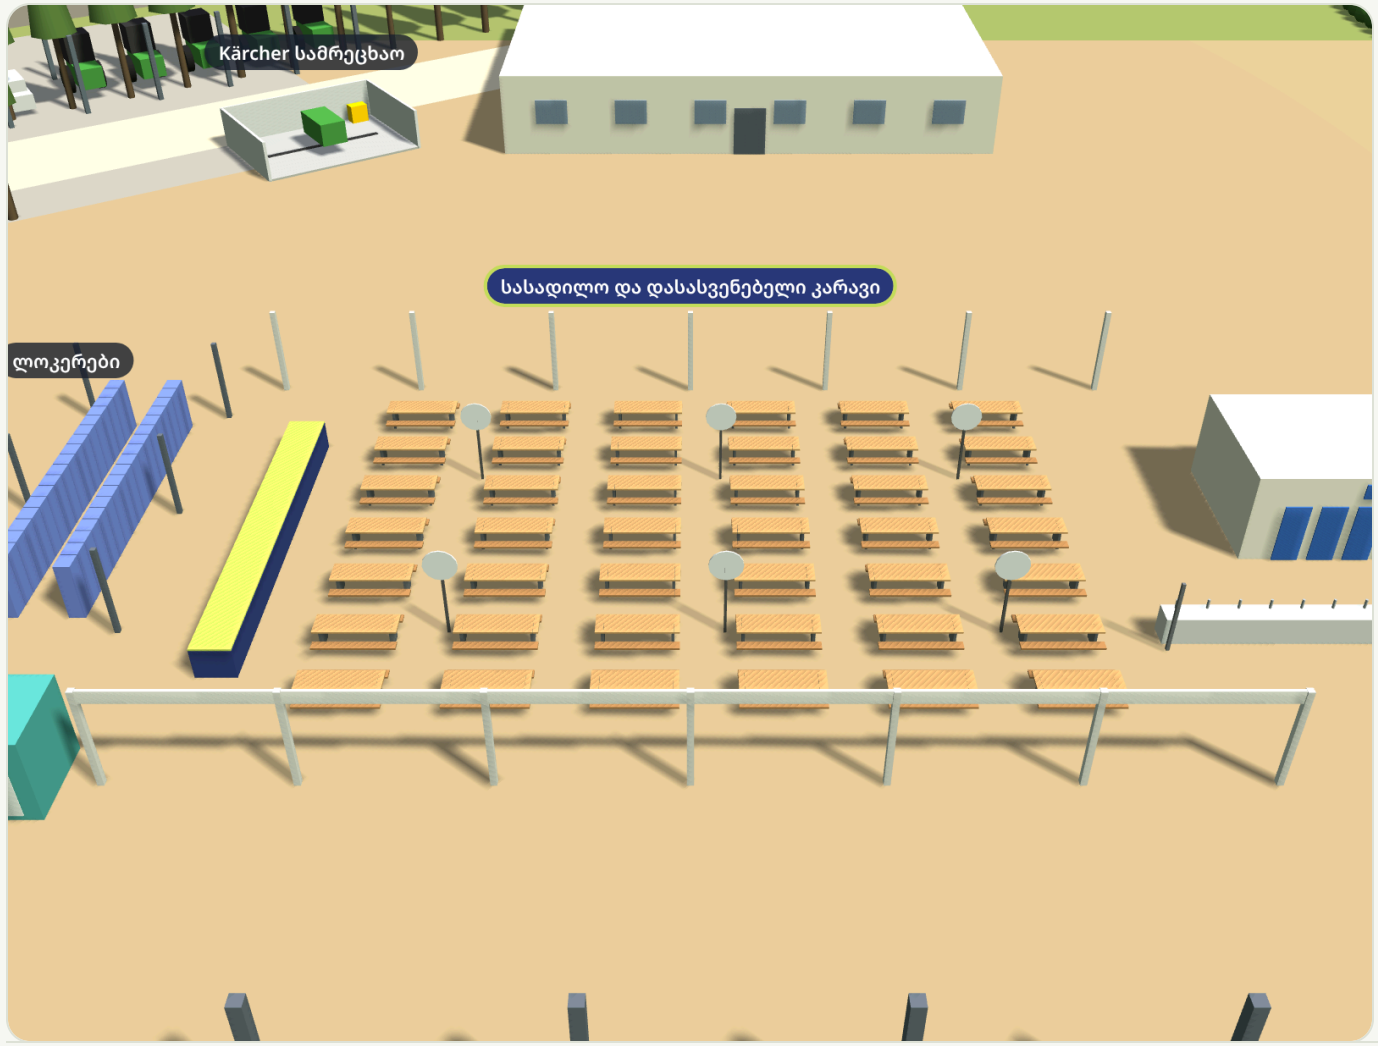

≈ 30 × 20 მ (600 მ²), ≈ 300 ადგილი. 500 კაცი ჭამს 2 ცვლად.

ვენტილატორები, განათება, საკვების გაცემის ზონა, წყლის დისპენსერები.

ასაწევი გვერდები ჰაერისთვის.

გვერდით: **36 ლოკერი** ფარდულის ქვეშ და **საშხაპე** 4 კაბინით.

საპირფარეშო და ხელსაბანები

კარვის გვერდით, გარეთ, სტაციონარული



შენობა ≈ 12 × 5 მ: ≈ 10 ქალთა და 10 მამაკაცთა კაბინა, ცალკე შესასვლელით.


10 ონკანიანი ხელსაბანი გარედან, ტუალეტსა და კარავს შორის.

წყალი და კანალიზაცია (ან სეპტიკი), განათება.

დასუფთავების გრაფიკი და პასუხისმგებელი პირი.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი

ერთი გადახურვის ქვეშ · გეგმაში: 7–24 დეკემბერი

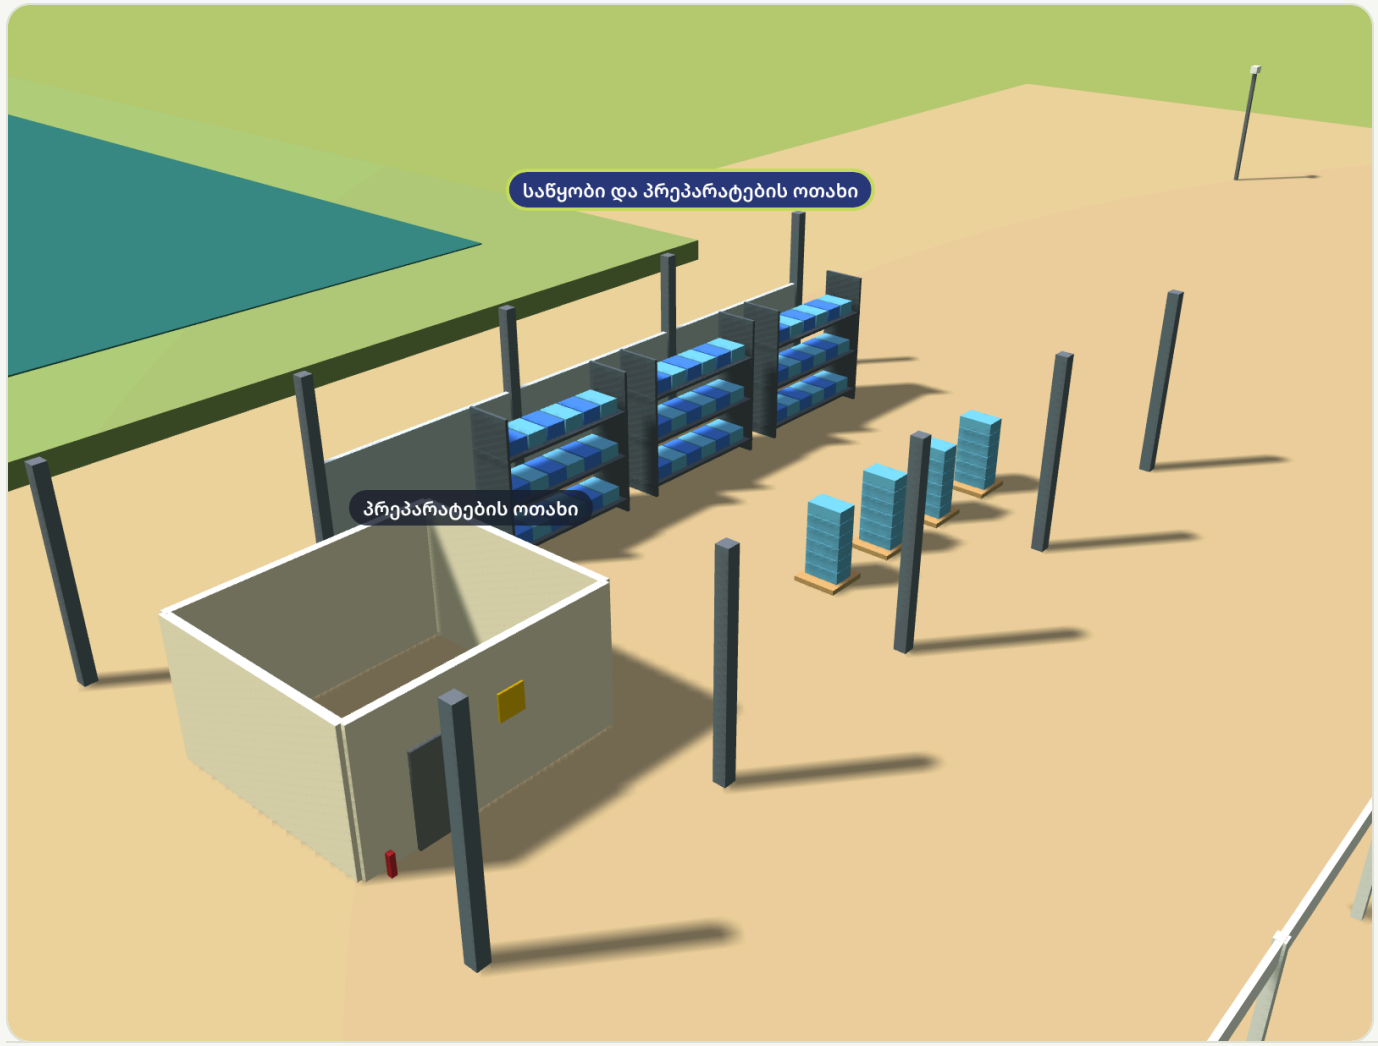

საწყობი ≈ 24 × 12 მ: ყუთები, პალეტები და ინვენტარი, მეტალის სტელაჟები 3 იარუსად.

პრეპარატების ოთახი ≈ 6 × 5 მ: ჩაკეტილი, ვენტილაციით.

ლითონის თაროები, ჩამოღვრის ტაფები, ცეცხლმაქრი, დაცვის საშუალებები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, თვალის სარეცხი.

პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი, შესვლა მხოლოდ პასუხისმგებელ პირს.

უნიფორმა

კომპანიის ფერებში. წინ ლოგო გულზე, უკან კომპანიის სახელი. გეგმაში: 9–30 ნოემბერი.

ზაფხულის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

მოკლე სახელო, თეთრი სუნთქვადი ქსოვილი: მზეზე ნაკლებად ცხელდება. ლურჯი ლოგო და ლაიმისფერი კანტი.

ზამთრის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

გრძელი სახელო, მოცვისფერი, თბილი ქსოვილი (ფლისი ან ბამბა). ლაიმისფერი კანტი.

ქურთუკი



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

წყალგაუმტარი, ელვაშესაკრავით და ჯიბეებით. ამრეკლი ლაიმისფერი ზოლები, რომ ბინდში ჩანდეს.

ინვენტარის ბიუჯეტი

ჩამონათვალი მზადაა. ფასები შეივსება დეკემბერში, შეთავაზებების მიღების შემდეგ, და ცალკე წარედგინება დასამტკიცებლად.

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)
სასწორები		—	—
სეკატორები (ფანცატურები)		—	—
კომპიუტერები		—	—
სამედიცინო ურნები		—	—
გენერატორები		—	—
ავეჯი		—	—
გადასატანი პუნქტი სეკატორების აღრიცხვისთვის	სახურავით, სავარძლით და ჩასაკეტი ყუთით	5	—
პირველადი დახმარების ყუთები	თითო ბრიგადაზე	8	—

მფლობელებთან შესათანხმებელი

1. **გეგმის დამტკიცება:** ეტაპები და ვადები ნოემბრიდან თებერვლამდე.
2. **ინფრასტრუქტურის განლაგება:** სადგომი, კარავი, საპირფარეშო, საწყობი და პრეპარატების ოთახი რუკის მიხედვით.
3. **ბიუჯეტი:** დეკემბერში, 3 კომპანიის შეთავაზების შედარებით, ცალკე დამტკიცება.
4. **უნიფორმის დიზაინი** და რაოდენობა.
5. **მარტი–აპრილი:** შემდეგი ეტაპის დაგეგმვა (აყვავება, ფუტკარი, მოსავლის მზადება).

გეგმის ცოცხალი ვერსია (ყოველთვის ბოლო მდგომარეობით) ხელმისაწვდომია ბმულით, რომელსაც დირექტორი გაგიზიარებთ.
