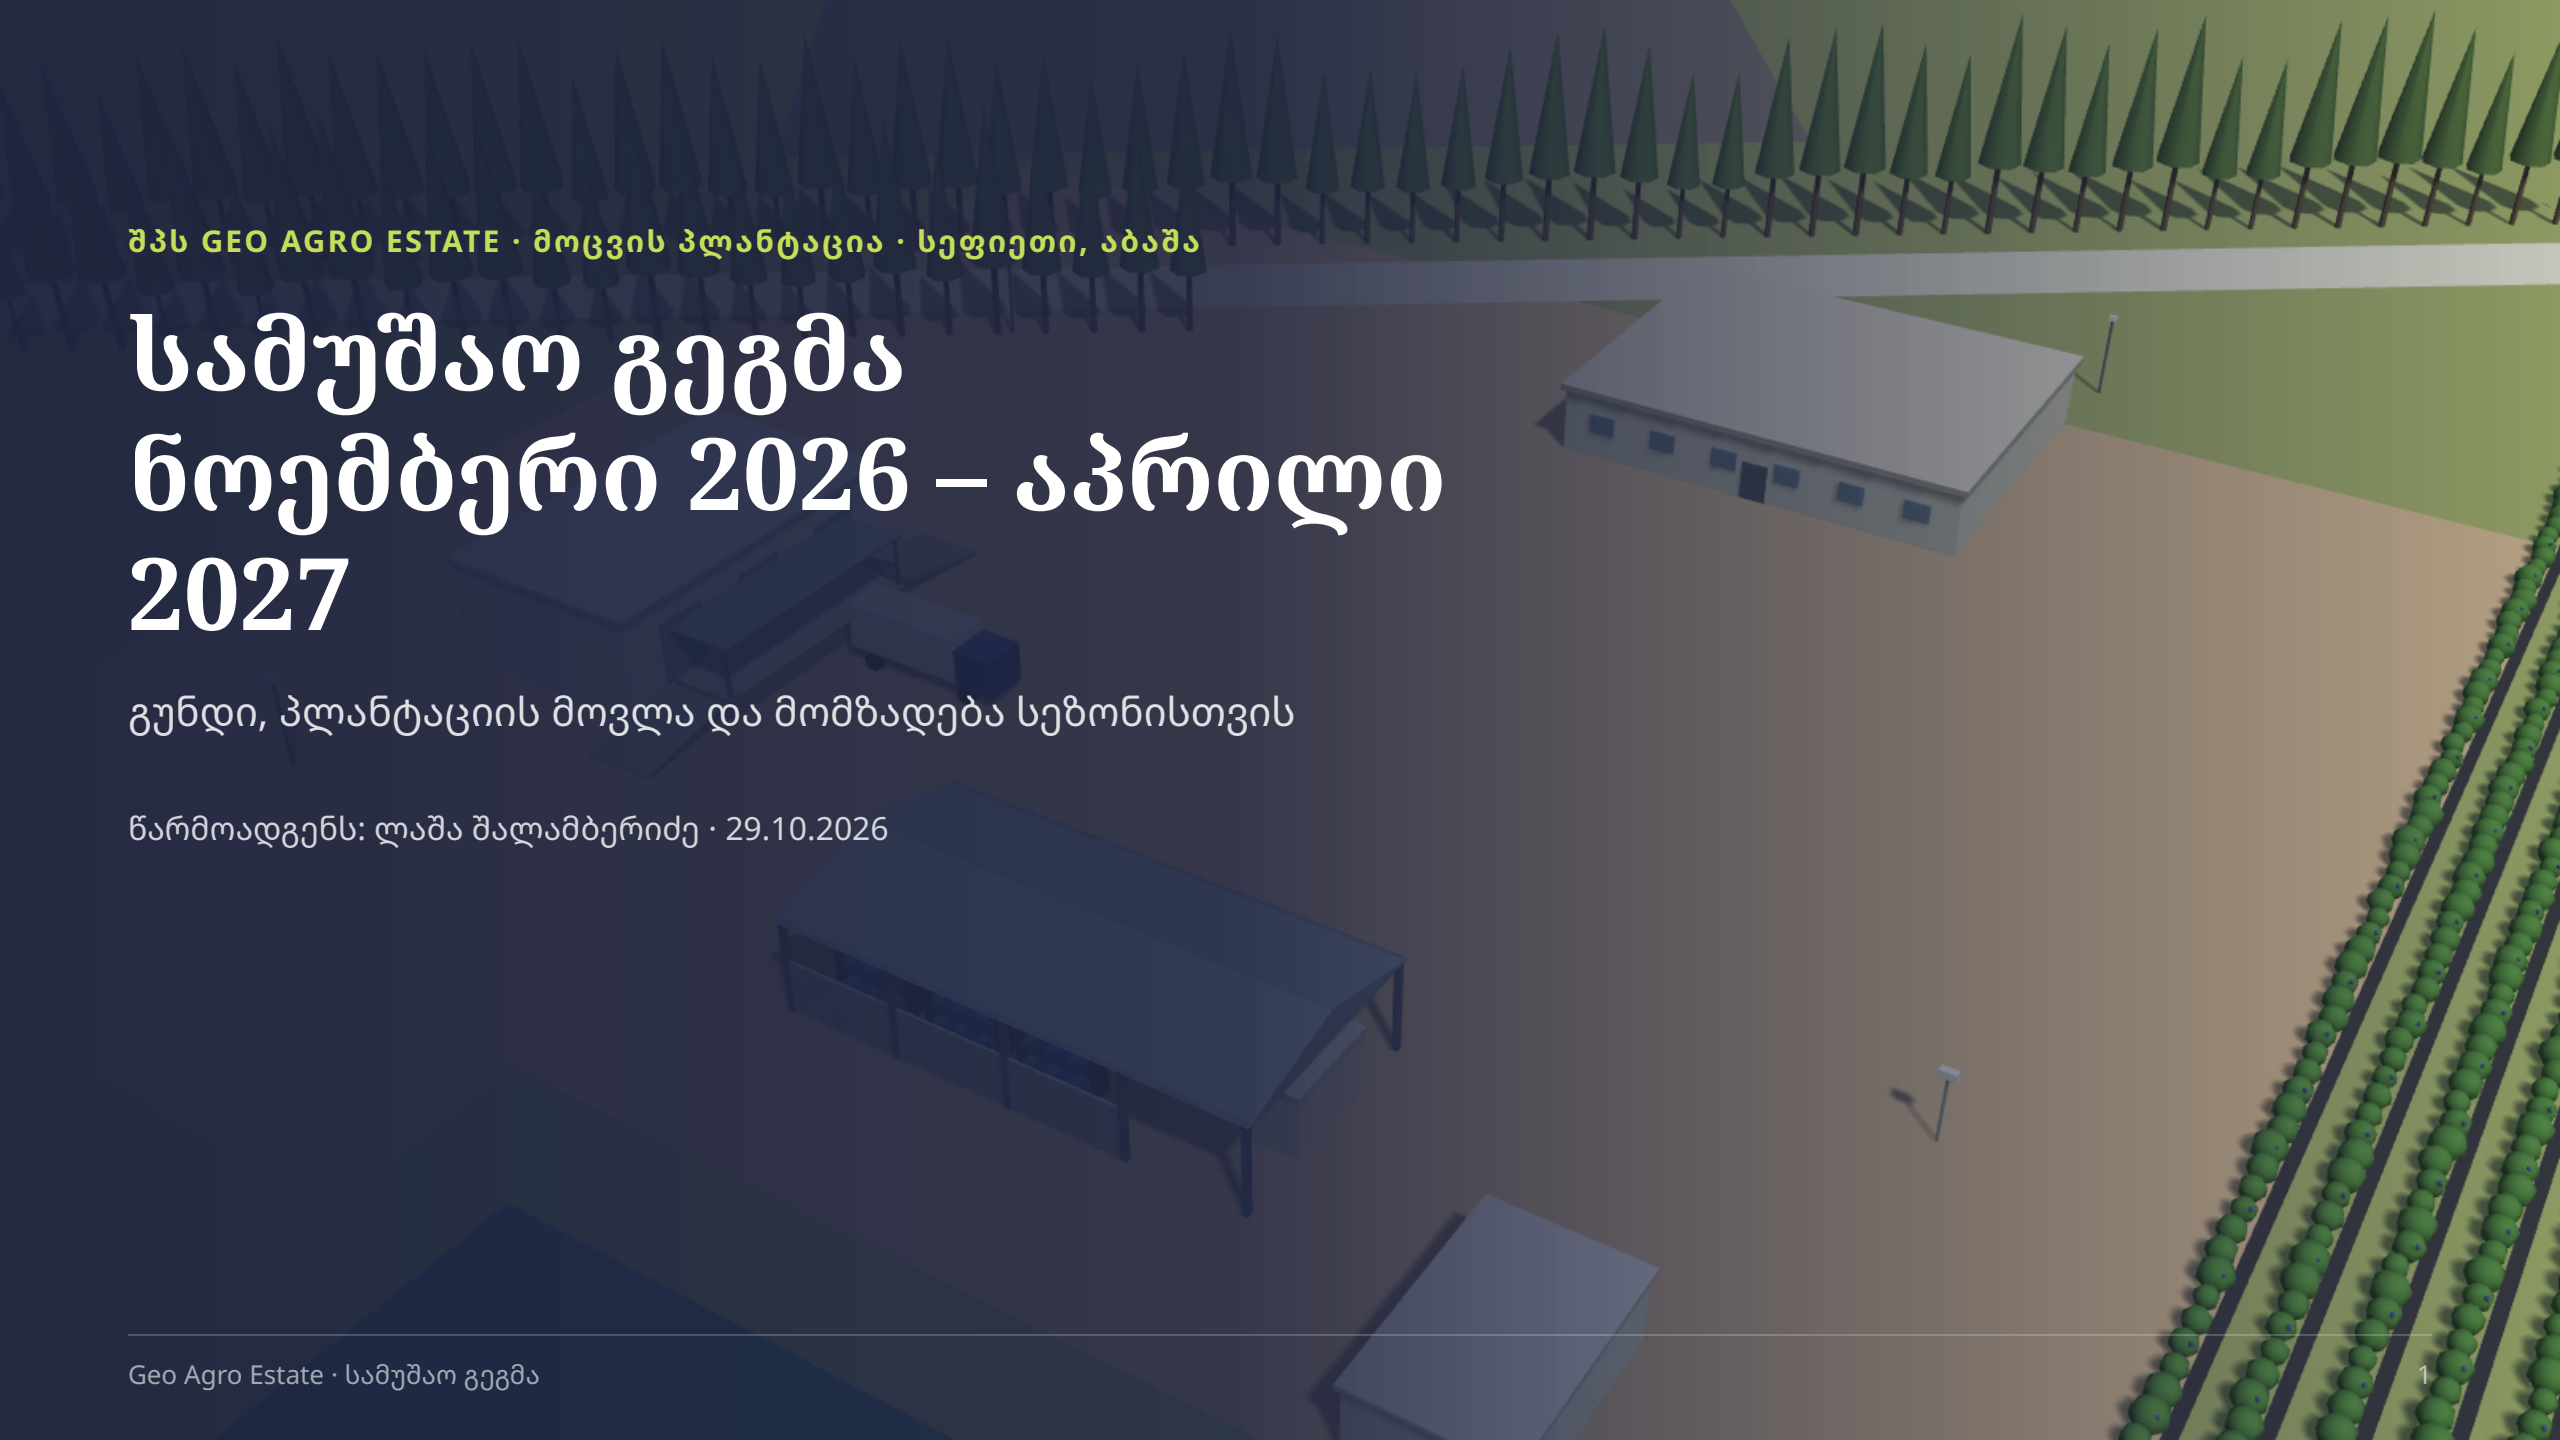


ШПС GEO AGRO ESTATE · მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა

სამუშაო გეგმა ნოემბერი 2026 – აპრილი 2027

გუნდი, პლანტაციის მოვლა და მომზადება სეზონისთვის

წარმოადგენს: ლაშა შალამბერიძე · 29.10.2026

ნაწილი 1

გამოწვევები და გამოსავალი

1

კრეფა და მოსავლის დაბინავება

500-მდე მკრეფავი, 21 სექტორი, ხარისხი და სწრაფი გადატანა სამაცივრეში.

2

რეალიზაცია

მყიდველები სეზონამდე: საქართველოში და უცხოეთში.

1 კრეფა და მოსავლის დაბინავება

გამოწვევა

- საკმარისი მკრეფავი სეზონზე, 500-მდე
- ორგანიზება და კონტროლი 21 სექტორზე
- ზუსტი აღრიცხვა: ვინ, სად, რამდენი მოკრიფა
- ხალხის შენარჩუნება მთელი სეზონი
- სწრაფი და დაუზიანებელი გადატანა სამაცივრეში

→

გამოსავალი

- **1.1** მკრეფავები საქართველოდან: მენეჯერები, რეკრუტერები, მუნიციპალიტეტები
- **1.2** უცხოელი მუშახელი: ეტაპობრივად, სააგენტოებით
- **1.3** ბრიგადირების შეხვედრა პლანტაციაში და უკეთესი პირობები
- **1.4** დაბინავება: მოძრავი პუნქტები, ესტაკადა, საწყობი, სამაცივრე

1.1 მკრეფავები საქართველოდან

მიზანი: მაქსიმუმ 500 მკრეფავი სეზონზე

1. 21 სექტორის მენეჯერი: თითოეული მოიყვანს 10 მკრეფავს (≈210 კაცი), ბონუსით თითო მოყვანილზე
2. 2 რეკრუტერი: ბონუსი მოყვანილი ადამიანების რაოდენობით, რაც მეტს მოიყვანს, მით მეტი
3. მუნიციპალიტეტები, სადაც ამ დროს სამუშაო არ არის (მაგ. შიდა ქართლი): ვიზიტები და ადგილობრივი კონტაქტები
4. თემის რწმუნებულები და ადგილობრივი ბრიგადირები სოფლებში
5. განცხადებები: Facebook-ჯგუფები, jobs.ge, hr.ge
6. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
7. სტუდენტები ზაფხულის სამუშაოზე (18+)
8. ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტებიდან და უკან
9. განთავსება: სახლების იჯარა სეზონის განმავლობაში

1.2 უცხოელი მუშახელი: ნაბიჯ-ნაბიჯ

სამართლებრივი მხარე წინასწარ გადამოწმდეს იურისტთან.

1. საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა
2. კანონმდებლობა: ნებართვები და რეგისტრაცია, კონსულტაცია იურისტთან
3. ლიცენზირებული სარეკრუტინგო სააგენტოები: 3 შეთავაზება
4. ქვეყნების შერჩევა, სადაც სეზონური მუშახელი ხელმისაწვდომია
5. ხელშეკრულება: ანაზღაურება, ვადა, პირობები
6. ვიზა/ბინადრობა და დაზღვევა
7. ჩამოყვანის ლოჯისტიკა: ბილეთები, დახვედრა
8. განთავსება (სახლების იჯარა) და კვება
9. კოორდინატორი/ თარჯიმანი
10. ადაპტაციის ბრიფინგი და ტრენინგი ჩამოსვლისთანავე

1.3 ბრიგადირები და პირობები

ბრიგადირების შეხვედრა პლანტაციაში · 1 თებ. – 14 თებ.

- მოწვევა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან
- ტრანსპორტი შეხვედრაზე
- პლანტაციის, პუნქტების და პირობების ჩვენება
- სტრატეგიის გაცნობა: სექტორები, აღრიცხვა, ანაზღაურება
- ბონუსები ბრიგადირებს მოყვანილი ჯგუფისთვის
- წინასწარი შეთანხმებები და ხელშეკრულებები

პირობების გაუმჯობესება

- ანაზღაურება დროულად, ყოველკვირეულად
- გამჭვირვალე აღრიცხვა: მკრეფავი ხედავს თავის კილოგრამებს (QR, SMS/Telegram)
- ტრანსპორტი სახლიდან პლანტაციამდე
- წყალი, ჩრდილი და შესვენება მოძრავ პუნქტებთან
- საცხოვრებელი შორიდან ჩამოსულებისთვის
- ბონუსი ხარისხზე და სეზონის ბოლომდე დარჩენაზე
- ბიოტუალეტები სექტორებთან

1.4 მოსავლის დაბინავება

1. მოძრავი პუნქტები (4–5) პლანტაციაში: ოპერატორი აღრიცხავს თითო ყუთს QR-ით
2. სავსე ყუთები ჩრდილში და სწრაფად სამაცივრეში
3. სამაცივრის ესტაკადა: ბაქანი სატვირთოს სიმაღლეზე, პანდუსები ორივე ბოლოში
4. საწყობი: სუფთა და ნახმარი ყუთები, ინვენტარი
5. სამაცივრის პასუხისმგებელი პირი: ტემპერატურა და აღრიცხვა
6. ტრენინგი: მოსავლის აღება და ჰიგიენა

2 რეალიზაცია

გამოწვევა

- მყიდველების მოძიება სეზონის დაწყებამდე
- ცნობადობა უცხოეთში
- პირდაპირი კონტაქტი შემსყიდველებთან და ქსელებთან
- სათადარიგო არხი, თუ მყიდველმა უარი თქვა
- ხარისხისა და წარმოშობის დამტკიცება

→

გამოსავალი

- **2.1** Facebook-გვერდი და ბუსტი უცხოეთში
- **2.2** საელჩოების ეკონომიკური ატაშეები და მარტის კონფერენცია
- **2.3** ეკონომიკური ღონისძიებები, გამოფენები, პრეზენტაციები
- **2.4** საერთაშორისო და მოცვის ასოციაციები: ქვეკონტრაქტორობა
- ხარისხი და მიკვლევადობა: ტრენინგები, წამლობის ჟურნალი, აღრიცხვა AgroInTechSol-ში

2.1 Facebook-გვერდი და ბუსტი უცხოეთში

ინტენსიურად, მთელი პერიოდის განმავლობაში.

1. გვერდის განახლება: ინგლისური და სამიზნე ქვეყნების ენები
2. კონტენტ-გეგმა: კვირაში 3 პოსტი, ვიდეო პლანტაციიდან და სამაცივრიდან
3. ფასიანი რეკლამა (ბუსტი) სამიზნე ქვეყნებში: იმპორტიორები, ქსელები
4. Instagram და TikTok იგივე კონტენტით
5. შეტყობინებებზე პასუხი 24 საათში
6. თვიური ანგარიში: მიღწევა, შეტყობინებები, კონტაქტები

2.2 ეკონომიკური ატაშეები და კონფერენცია

ატაშეების მოწვევა და ჩვენება · 1 თებ. – 20 მარტ.

- სამიზნე ქვეყნების საელჩოების სია
- მოწვევა და ვიზიტის თარიღები
- პლანტაციის, სამაცივრის და საწყობის ჩვენება
- კომპანიის პრეზენტაცია ინგლისურად
- ნიმუშები და ფასების ფურცელი
- შემდგომი კონტაქტები იმპორტიორებთან

კონფერენცია და 2-დღიანი ტური · მარტი

- მოსაწვევი სია: პირდაპირი შემსყიდველები და ქსელების ხელმძღვანელები
- მოწვევის გაგზავნა და დადასტურება
- 2-დღიანი პროგრამა
- პლანტაციის, სამაცივრის და საწყობის დათვალიერება
- ტური საქართველოში
- ტრანსპორტი და სასტუმრო
- კომპანიის პრეზენტაცია
- შეხვედრების შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები

2.3 ღონისძიებები, გამოფენები, პრეზენტაციები

ზუსტი თარიღები დასაზუსტებელია.

1. ღონისძიებების კალენდარი: საქართველო და უცხოეთი
2. საერთაშორისო გამოფენები, მაგ. Fruit Logistica (ბერლინი), Gulfood (დუბაი)
3. საწარმოო საქართველოს (Enterprise Georgia) საექსპორტო პროგრამები და სავაჭრო მისიები
4. ბიზნეს-ფორუმები და B2B შეხვედრები
5. კომპანიის პრეზენტაცია და კატალოგი ინგლისურად
6. ნიმუშები, ფასების ფურცელი, სერტიფიკატები

2.4 ასოციაციებში გაწევრიანება

წევრობით შეიძლება გავხდეთ ქვეკონტრაქტორი: თუ უცხოელ მიმწოდებელს გაუჭირდა, შეკვეთას ჩვენ ვასრულებთ.

1. ასოციაციების სია: მოცვის საერთაშორისო ასოციაციები (მაგ. International Blueberry Organization), ხილის მწარმოებლებისა და ექსპორტიორების ასოციაციები
2. ქართული ასოციაციები (მაგ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია)
3. წევრობის პირობები და საწევრო გადასახადი
4. განაცხადი და გაწევრიანება
5. წევრების კატალოგში და მიმწოდებლების სიაში მოხვედრა
6. მონაწილეობა შეხვედრებსა და ვებინარებში
7. კონტაქტები უცხოელ მიმწოდებლებთან: ქვეკონტრაქტორად ან სათადარიგო მიმწოდებლად შეთავაზება

ნაწილი 2

სამუშაო გეგმა

მიზანი, სტრუქტურა, ეტაპები, გრაფიკი, ამოცანები, ტერიტორია, ფინანსები

მიზანი

სეზონის დაწყებისთვის კომპანიას უნდა ჰქონდეს გაწვრთნილი გუნდი, მოწესრიგებული პლანტაცია, საკმარისი მკრეფავები და მზა სამუშაო პირობები.

1

გუნდი

სტრუქტურა და 21 სექტორის მენეჯერი, ტრენინგები, ერთიანი უნიფორმა, უსაფრთხოება.

2

პლანტაცია

გასხვლა 1 დეკემბრიდან 31 იანვრამდე, წამლობა და მოვლა.

3

სეზონი

მოძრავი პუნქტები, საწყობი, სამაცივრის ესტაკადა, ბიოტუალეტების იჯარა, მკრეფავების მოზიდვა, შემსყიდველების კონფერენცია.

500 მკრეფავი მაქსიმუმ

21 სექტორი

4–5 მოძრავი პუნქტი

AgroInTechSol აღრიცხვა: QR, სასწორი, რეპორტები

სტრუქტურა


დირექტორი
აგრონომია
აგრონომი
აგრონომის თანაშემწე
საველე სამუშაოები
მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი
სექტორის მენეჯერები
21
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21
საველე კადრების მენეჯერი
მკრეფავებზე პასუხისმგებელი
მკრეფავები
≤ 500
საწყობი და სამაცივრე
საწყობის მენეჯერი
საწყობი და ტექნიკა
სამაცივრის პასუხისმგებელი
ადმინისტრაცია
ადმინისტრატორი
დაცვა

ეტაპები

ეტაპი 1

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

დაკომპლექტებული, გაწვრთნილი და ფორმიანი გუნდი.

4 ამოცანა

ეტაპი 2

დეკემბერი 2026

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის დაწყება (იანვრის ბოლომდე); შერჩეული კომპანიები, ფასები და ინვენტარის ბიუჯეტი.

11 ამოცანა

ეტაპი 3

იანვარი – აპრილი 2027

საწყობი და მკრეფავები

საწყობი და პრეპარატების ოთახი, მოძრავი პუნქტები, მკრეფავების მოზიდვა; დასრულება აპრილის ბოლომდე.

5 ამოცანა

ეტაპი 4

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მოწვეული მკრეფავები, ნაჩვენები მიმდინარე სამუშაოები, გადამოწმებული სიები.

4 ამოცანა

ეტაპი 5

მარტი 2027


გაყიდვები

შემსყიდველებისა და ქსელების ხელმძღვანელების კონფერენცია, 2-დღიანი ტური საქართველოში.

1 ამოცანა

გრაფიკი

პერსონალი · აგრო-სამუშაოები · ინფრასტრუქტურა · შესყიდვები / ბიუჯეტი · მოსავალი / მკრეფავები · გაყიდვები

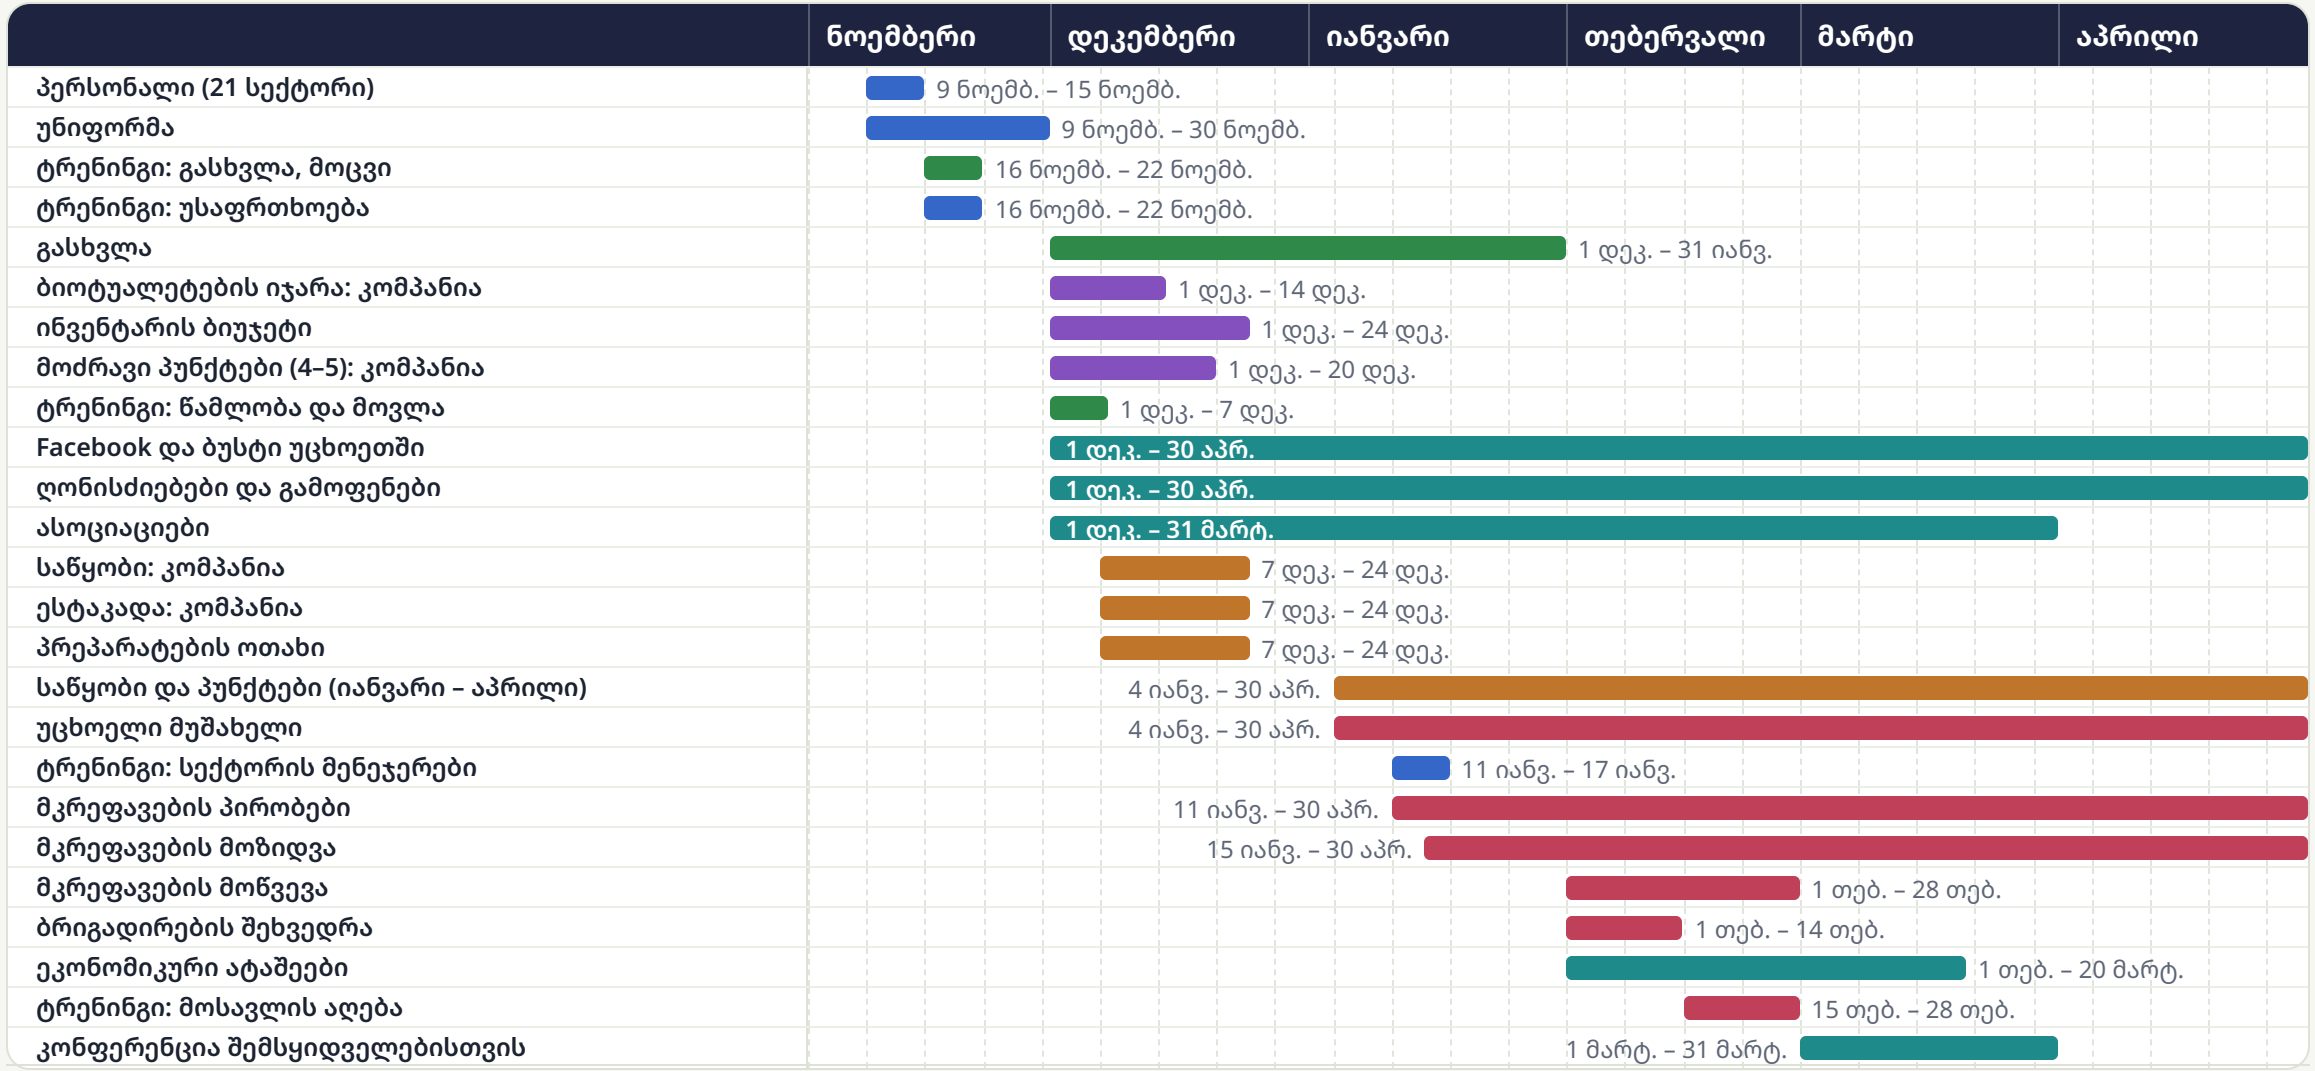

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება სექტორების მიხედვით (21 სექტორი)

9 ნოემბ. – 15 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- სექტორების ჩამონათვალი: 21 სექტორი (ნომერი, საზღვრები, ფართობი)
- სექტორის მენეჯერები: 21, თითო სექტორზე
- მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი (21 სექტორის მენეჯერზე)
- აგრონომი და აგრონომის თანაშემწე
- საველე კადრების მენეჯერი (მკრეფავებზე პასუხისმგებელი)
- საწყობის მენეჯერი (საწყობი და ტექნიკა)
- სამაცივრის პასუხისმგებელი პირი
- ადმინისტრატორი
- დაცვა
- მუშების რაოდენობა თითო სექტორზე
- ვაკანსია, გასაუბრებები, ხელშეკრულებები
- სია სექტორების მიხედვით (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება

9 ნოემბ. – 30 ნოემბ.

პერსონალი

- ზომების შეგროვება
- ზაფხულის მაისური (მოკლე სახელო, თეთრი)
- ზამთრის მაისური (გრძელი სახელო, მოცვისფერი)
- ქურთუკი (წყალგაუმტარი, ამრეკლი ზოლებით)
- მომწოდებლის შერჩევა
- ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება
- შეკვეთა და დარიგება

ტრენინგები: ნოემბერი

16–22 ნოემბერი

ტრენინგი: გასხვლა და მოცვის საფუძვლები

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- მოცვი: რა არის მოცვი, ჯიშები, ზრდის ციკლი
- მოცვის მოთხოვნები: ნიადაგი (pH 4.5–5.5), წყალი, მულჩი
- გასხვლის წესები (თეორია)
- გასხვლის პრაქტიკა ნაკვეთზე, სექტორების მიხედვით
- სეკატორების გამოყენება, დეზინფექცია და აღრიცხვა
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ტრენინგი: შრომის უსაფრთხოება და პირველადი დახმარება

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ადმინისტრატორი/HR

- ტერიტორიის წესები: მოძრაობა ეზოში, ტექნიკასთან და ავტომობილებთან
- ხელსაწყოების უსაფრთხო გამოყენება (სეკატორები, დანები, კიბეები)
- მუშაობა სიცხეში და სიცივეში: წყალი, ჩრდილი, შესვენება, ტანსაცმელი
- პირველადი დახმარება: ჭრილობა, სიცხის დარტყმა, ალერგია, მოწამვლა
- ცეცხლსაქრობები და ევაკუაციის გეგმა
- საგანგებო ტელეფონები, ვის მიმართო
- ინციდენტის შეტყობინება და ჩაწერა
- დასწრების ფურცელი ხელმოწერით

ტრენინგები: დეკემბერი – თებერვალი

წამლობა, სექტორის მენეჯერები, მოსავლის აღება

ტრენინგი: წამლობა და მოცვის მოვლა

1 დეკ. – 7 დეკ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- წამლობა: პრეპარატები, დოზები, ხსნარის მომზადება
- დაცვის საშუალებები: ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე, კომბინეზონი
- ლოდინის ვადა (PHI) და წამლობის ჟურნალი
- შემსხურებლის კალიბრაცია და გარეცხვა
- პრეპარატების ოთახის წესები, ჩამოღვრისას მოქმედება
- მოცვის დაავადებები და მავნებლები: ამოცნობა
- სექტორის მენეჯერები: სექტორის გეგმა და აღრიცხვა AgroInTechSol-ში
- ტესტი და დასწრების ფურცელი ხელმოწერით

ტრენინგი: სექტორის მენეჯერები

11 იანვ. – 17 იანვ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- როლი და პასუხისმგებლობა, ვის ექვემდებარება
- დღის გეგმა და სამუშაოს განაწილება სექტორში
- დასწრება და აღრიცხვა AgroInTechSol-ში (QR, რეპორტები)
- ხარისხის კონტროლი სექტორში
- უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სექტორში
- ხალხთან ურთიერთობა, კონფლიქტის მოგვარება
- ყოველკვირეული რეპორტი მთავარ ზედამხედველ მენეჯერს

ტრენინგი: მოსავლის აღება და ჰიგიენა

15 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- კრეფის ტექნიკა: მხოლოდ მწიფე კენკრა, ფრთხილად, ცვილის შენარჩუნებით
- კრეფა პირდაპირ შეფუთვაში (კლამშელი), არ გადაავსო
- ხარისხის სტანდარტი: რა არ იკრიფება (დაზიანებული, მკვახე, დაჭყლეტილი)
- ჰიგიენა: ხელების დაბანა, სამკაულის გარეშე, ავადმყოფობისას არ მუშაობს
- სავსე ყუთები ჩრდილში და სწრაფად სამაცივრეში
- QR-ბარათი და აწონვა AgroInTechSol-ში
- ანაზღაურება და ხარისხზე მიბმული ბონუსი
- რიგების და სექტორების თანმიმდევრობა

დეკემბერი 2026: გასხვლა და შესყიდვები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება

1 დეკ. – 31 იანვ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

ბიოტუალეტების იჯარა სეზონის განმავლობაში: კომპანიის მოძიება

1 დეკ. – 14 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- რაოდენობა (500 მკრეფავზე)
- განთავსება სექტორებთან და პუნქტებთან
- დაცლისა და დასუფთავების გრაფიკი
- იჯარის ვადა: სეზონი
- 3 კომპანიის შეთავაზება

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება

1 დეკ. – 24 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- სასწორები
- სეკატორები (ფანცატურები)
- კომპიუტერები
- სამედიცინო ურნები
- გენერატორები
- ავეჯი
- სეკატორები გასხვლის ინვენტარი

კომპანიის მოძიება: მოძრავი გადაფარებული პუნქტები (4–5)

1 დეკ. – 20 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- გადაფარება (სახურავი) მზისა და წვიმისგან
- ბორბლებზე: გადატანა სექტორიდან სექტორზე
- ოპერატორის ადგილი: კომპიუტერი და პრინტერი
- აღრიცხვა AgroInTechSol-ში: სეკატორების გაცემა, კრეფა QR-ით
- მაცივარი წყლისთვის
- გასაშლელი მაგიდები და სკამები შესვენებისა და სადილისთვის
- ჩასაკეტი ყუთი სეკატორებისთვის
- დენი: გენერატორი
- 3 კომპანიის შეთავაზება

დეკემბერი 2026: სამაცივრე და საწყობი

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- თაროები / სტელაჟები
- შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა)

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- გაზომვები
- ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე, სახურავით
- პანდუსები ორივე ბოლოში: ერთზე ადიან, მეორეზე ჩამოდიან
- 3 კომპანიის შეთავაზება

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- ვენტილაცია
- თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- ცეცხლმაქრი
- დაცვის საშუალებები (ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე)
- გამაფრთხილებელი ნიშნები და წესების დაფა
- პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი
- ხელსაბანი / თვალის სარეცხი

იანვარი – აპრილი 2027

საწყობი და მკრეფავები

საწყობის მშენებლობა და პუნქტების მომზადება

4 იანვ. – 30 აპრ.

ინფრასტრუქტურა

- საწყობი და პრეპარატების ოთახი
- სამაცივრის ესტაკადა პანდუსებით
- მოძრავი გადაფარებული პუნქტები (4–5): აწყობა და აღჭურვა
- ბიოტუალეტების იჯარის ხელშეკრულება სეზონზე
- ინვენტარის შეძენა ბიუჯეტის მიხედვით

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მკრეფავების მოწვევა, მიმდინარე სამუშაოების ჩვენება და სიების გავლა

1 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები

- მკრეფავების მოწვევა
- მიმდინარე მშენებლობის ჩვენება: რა იქნება სეზონისთვის
- სიების გადამოწმება

ტერიტორია



ადმინისტრაცია ჩრდილოეთით, გზიდან შესასვლელთან.

სამაცივრე (არსებული) ადმინისტრაციის სამხრეთ-დასავლეთით, ესტაკადით.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი ერთი გადახურვის ქვეშ, აუზის ზემოთ.

მოძრავი პუნქტები (4–5) პლანტაციაში, ნაკვეთებს შორის, გადაადგილდება სექტორებს შორის.

ბიოტუალეტები იჯარით, სეზონზე, სექტორებთან.

პლანტაცია აღმოსავლეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 21 სექტორი.

მოძრავი გადაფარებული პუნქტები



4–5 პუნქტი, ≈ 6 × 4 მ: სეზონური, ბორბლებზე, პლანტაციაში, ნაკვეთებს შორის.


ოპერატორი: კომპიუტერი და პრინტერი, აღრიცხვა AgroInTechSol-ში (სეკატორები, კრეფა QR-ით).

მაცივარი წყლისთვის.

გასაშლელი მაგიდები და სკამები შესვენებისა და სადილისთვის.

დენი: გენერატორი.

სამაცივრე და ესტაკადა

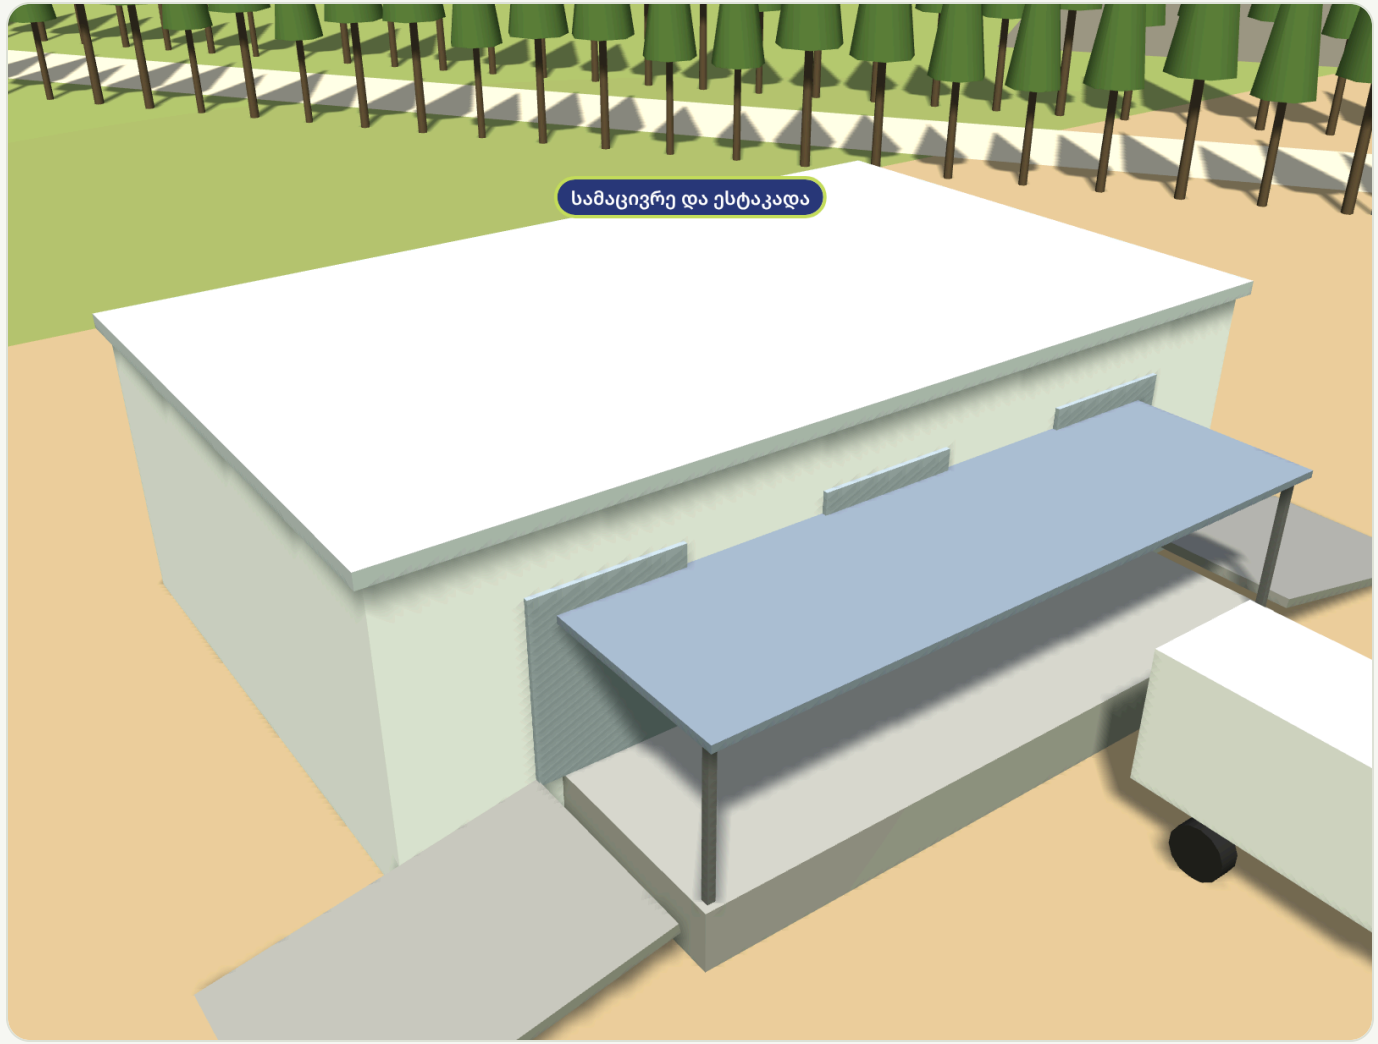

სამაცივრე უკვე დგას, მასში ინახება მოცვი.

ესტაკადა ≈ 12 × 4 მ: ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე (1.2 მ), სახურავით.


პანდუსები ორივე ბოლოში: ერთზე ადიან, მეორეზე ჩამოდიან.

რეზინის ბამპერები, მოაჯირი, განათება.

პასუხისმგებელი: სამაცივრის პასუხისმგებელი პირი.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი

ერთი გადახურვის ქვეშ

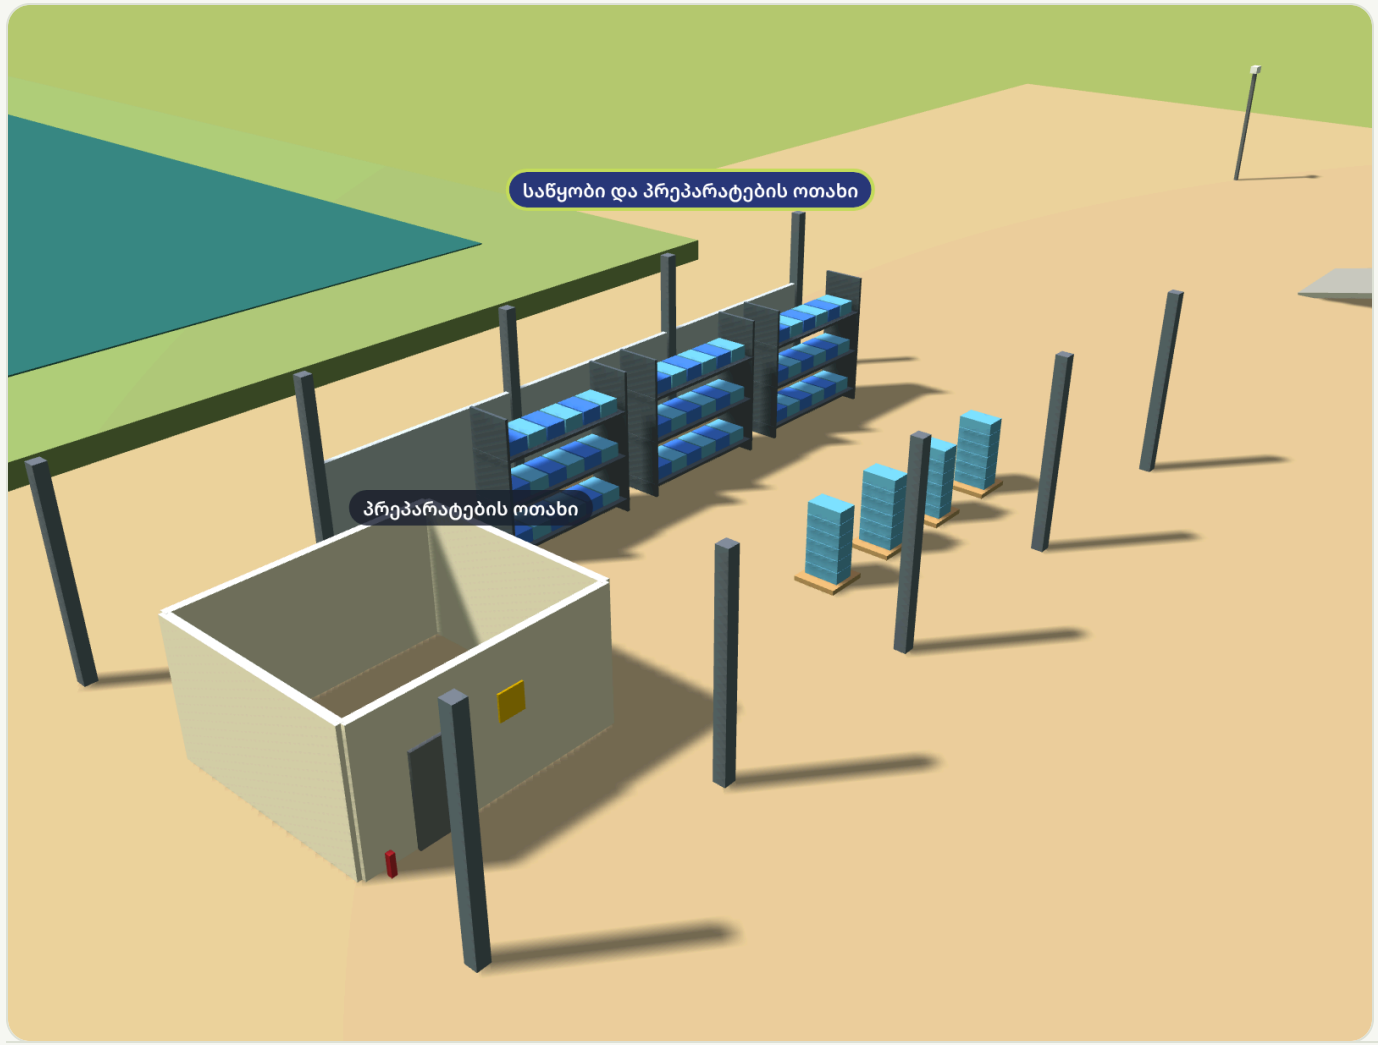

საწყობი ≈ 24 × 12 მ: ყუთები, პალეტები და ინვენტარი, მეტალის სტელაჟები 3 იარუსად.

პრეპარატების ოთახი ≈ 6 × 5 მ: ჩაკეტილი, ვენტილაციით.

ლითონის თაროები, ჩამოღვრის ტაფები, ცეცხლმაქრი, დაცვის საშუალებები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, თვალის სარეცხი.

პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი, შესვლა მხოლოდ პასუხისმგებელ პირს.

უნიფორმა

წინ ლოგო, უკან კომპანიის სახელი

ზაფხულის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ზამთრის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ქურთუკი



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ფინანსები

ხელფასები	სეზონური ხარჯები	ერთჯერადი ხარჯები	გაყიდვები	სულ
—	—	—	—	—

მუხლი	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)	თვე	ჯამი
ხელფასები					—
აგრონომი		1	—	—	—
აგრონომის თანაშემწე		1	—	—	—
მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი		1	—	—	—
სექტორის მენეჯერები		21	—	—	—
საველე კადრების მენეჯერი		1	—	—	—
საწყობის მენეჯერი		1	—	—	—
სამაცივრის პასუხისმგებელი		1	—	—	—
ადმინისტრატორი		1	—	—	—
დაცვა		—	—	—	—
ოპერატორები	მოძრავ პუნქტებზე	5	—	—	—

ფინანსები: სეზონური ხარჯები

მუხლი	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)	თვე	ჯამი
სეზონური ხარჯები					—
მკრეფავების ანაზღაურება	კგ-ზე ან დღიურად	—	—	—	—
ბონუსი მენეჯერებს	თითო მოყვანილ მკრეფავზე	210	—	—	—
ბიოტუალეტების იჯარა	სეზონის განმავლობაში	—	—	—	—
სახლების იჯარა მკრეფავებისთვის	სეზონის განმავლობაში	—	—	—	—
უნიფორმა	ზაფხულის, ზამთრის, ქურთუკი	—	—	—	—
ტრენინგები	5 ტრენინგი	—	—	—	—
რეკრუტერების ბონუსი	2 კაცი, მოყვანილი ადამიანების მიხედვით	2	—	—	—
უცხოელი მუშახელი	სააგენტო, ვიზა, დაზღვევა, ბილეთები	—	—	—	—
მკრეფავების ტრანსპორტი	მუნიციპალიტეტებიდან და სახლებიდან	—	—	—	—

ფინანსები: ერთჯერადი ხარჯები და გაყიდვები

მუხლი	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)	თვე	ჯამი
ერთჯერადი ხარჯები					—
საწყობი და პრეპარატების ოთახი		—	—	—	—
სამაცივრის ესტაკადა	პანდუსებით	—	—	—	—
მოძრავი გადაფარებული პუნქტები		5	—	—	—
ინვენტარი	ინვენტარის ცხრილიდან				—
გაყიდვები					—
შემსყიდველების კონფერენცია და ტური	მარტი, 2 დღე	—	—	—	—
Facebook/Instagram რეკლამა	ბუსტი უცხოეთში, თვეში	—	—	5	—
გამოფენები და ღონისძიებები	მონაწილეობა, მგზავრობა, სტენდი	—	—	—	—
ატაშეების ვიზიტი და პრეზენტაცია	ტრანსპორტი, ნიმუშები, მასალები	—	—	—	—
ასოციაციების საწევრო	წლიური	—	—	—	—

ინვენტარი

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)
სასწორები		—	—
სეკატორები (ფანცატურები)		—	—
კომპიუტერები		—	—
სამედიცინო ურნები		—	—
გენერატორები		—	—
ავეჯი		—	—
პირველადი დახმარების ყუთები	თითო ბრიგადაზე	8	—
წყლის მაცივარი	თითო პუნქტზე	5	—
პრინტერი	თითო პუნქტზე	5	—
გასაშლელი მაგიდები და სკამები	შესვენებისა და სადილისთვის	—	—

შესათანხმებელი

1. **გეგმა და ვადები:** ნოემბერი 2026 – აპრილი 2027.
2. **სტრუქტურა:** 21 სექტორის მენეჯერი და პასუხისმგებელი პირები.
3. **სეზონის პირობები:** მოძრავი პუნქტები (4–5), სამაცივრის ესტაკადა, საწყობი და პრეპარატების ოთახი, ბიოტუალეტების იჯარა.
4. **მკრეფავები:** მენეჯერებისა და რეკრუტერების ბონუსები, მუნიციპალიტეტები, ბრიგადირები, უცხოელი მუშახელი, პირობები.
5. **ფინანსები:** ხარჯების მუხლები და თანხები, 3 კომპანიის შეთავაზების შედარებით.
6. **რეალიზაცია:** Facebook-ბუსტი უცხოეთში, ატაშეები, ღონისძიებები, ასოციაციები, მარტის კონფერენცია.
