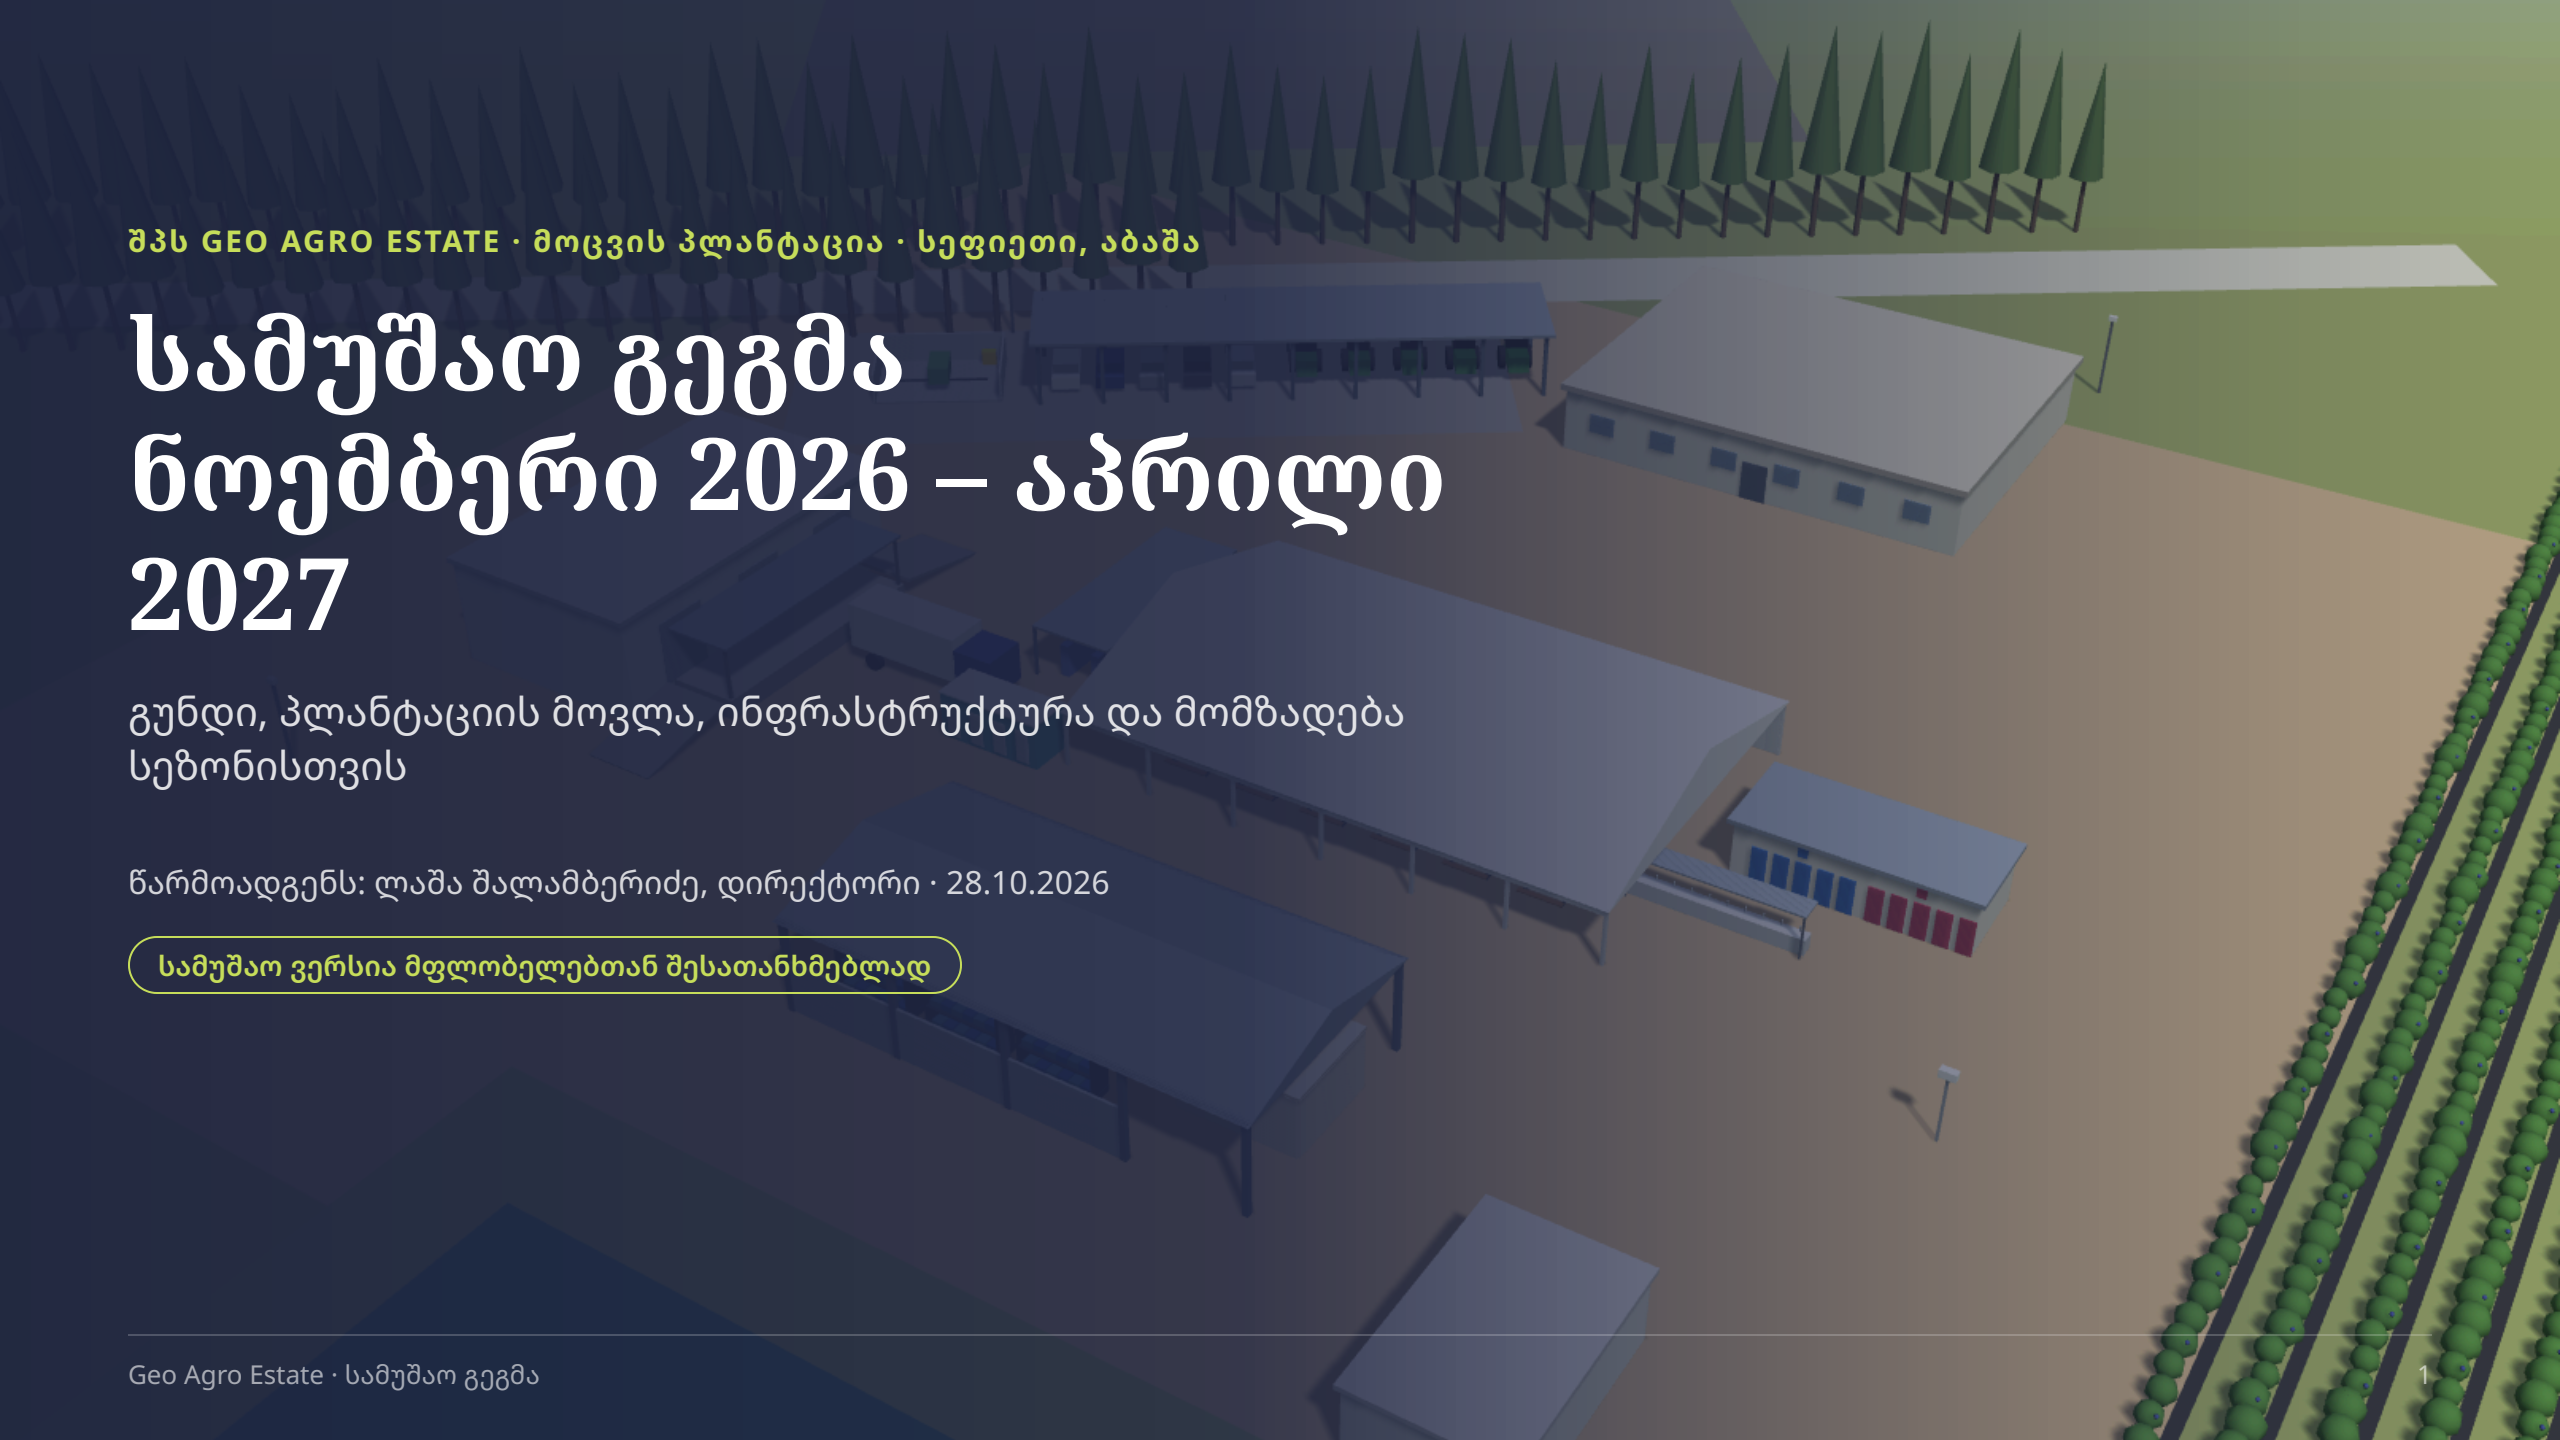


ШПС GEO AGRO ESTATE · მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა

სამუშაო გეგმა ნოემბერი 2026 – აპრილი 2027

გუნდი, პლანტაციის მოვლა, ინფრასტრუქტურა და მომზადება სეზონისთვის

წარმოადგენს: ლაშა შალამბერიძე, დირექტორი · 28.10.2026

სამუშაო ვერსია მფლობელებთან შესათანხმებლად

მიზანი

სეზონის დაწყებისთვის კომპანიას უნდა ჰქონდეს გაწვრთნილი გუნდი, მოწესრიგებული პლანტაცია და მზა ინფრასტრუქტურა მკრეფავებისთვის, ტექნიკისთვის და პროდუქციისთვის.

1

გუნდი

დაკომპლექტებული პერსონალი, გასხვლის ტრენინგი, ერთიანი უნიფორმა, უსაფრთხოების წესები.

2

პლანტაცია

ბალახის მოშორება და ზამთრის გასხვლა დეკემბრის ბოლომდე. ეს განსაზღვრავს მომავალ მოსავალს.

3

ინფრასტრუქტურა

სადგომი, სამრეცხაო, კარავი, სანიტარული კვანძი, საწყობი, პრეპარატების ოთახი, ესტაკადა.

500 მკრეფავი მაქსიმუმ

5 + 5 ავტომობილი და ტრაქტორი

4 თვე სეზონამდე

AgroInTechSol აღრიცხვა: QR, სასწორი, რეპორტები

ეტაპები

ეტაპი 1

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

დაკომპლექტებული, გაწვრთნილი და ფორმიანი გუნდი; ბალახისგან გაწმენდილი რიგები.

4 ამოცანა

ეტაპი 2

დეკემბერი 2026

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის დაწყება (იანვრის ბოლომდე); შერჩეული კომპანიები, ფასები და ინვენტარის ბიუჯეტი.

9 ამოცანა

ეტაპი 3

იანვარი – აპრილი 2027

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

დაწყება იანვარში, დასრულება აპრილის ბოლომდე: სადგომი, კარავი, სანიტარული კვანძი, საწყობი, ესტაკადა.

1 ამოცანა

ეტაპი 4

თებერვალი 2027


მკრეფავების მომზადება

მოწვეული მკრეფავები, ნაჩვენები მიმდინარე სამუშაოები, გადამოწმებული სიები, მუშების უსაფრთხოება.

2 ამოცანა

გრაფიკი

პერსონალი · აგრო-სამუშაოები · ინფრასტრუქტურა · შესყიდვები / ბიუჯეტი · მოსავალი / მკრეფავები

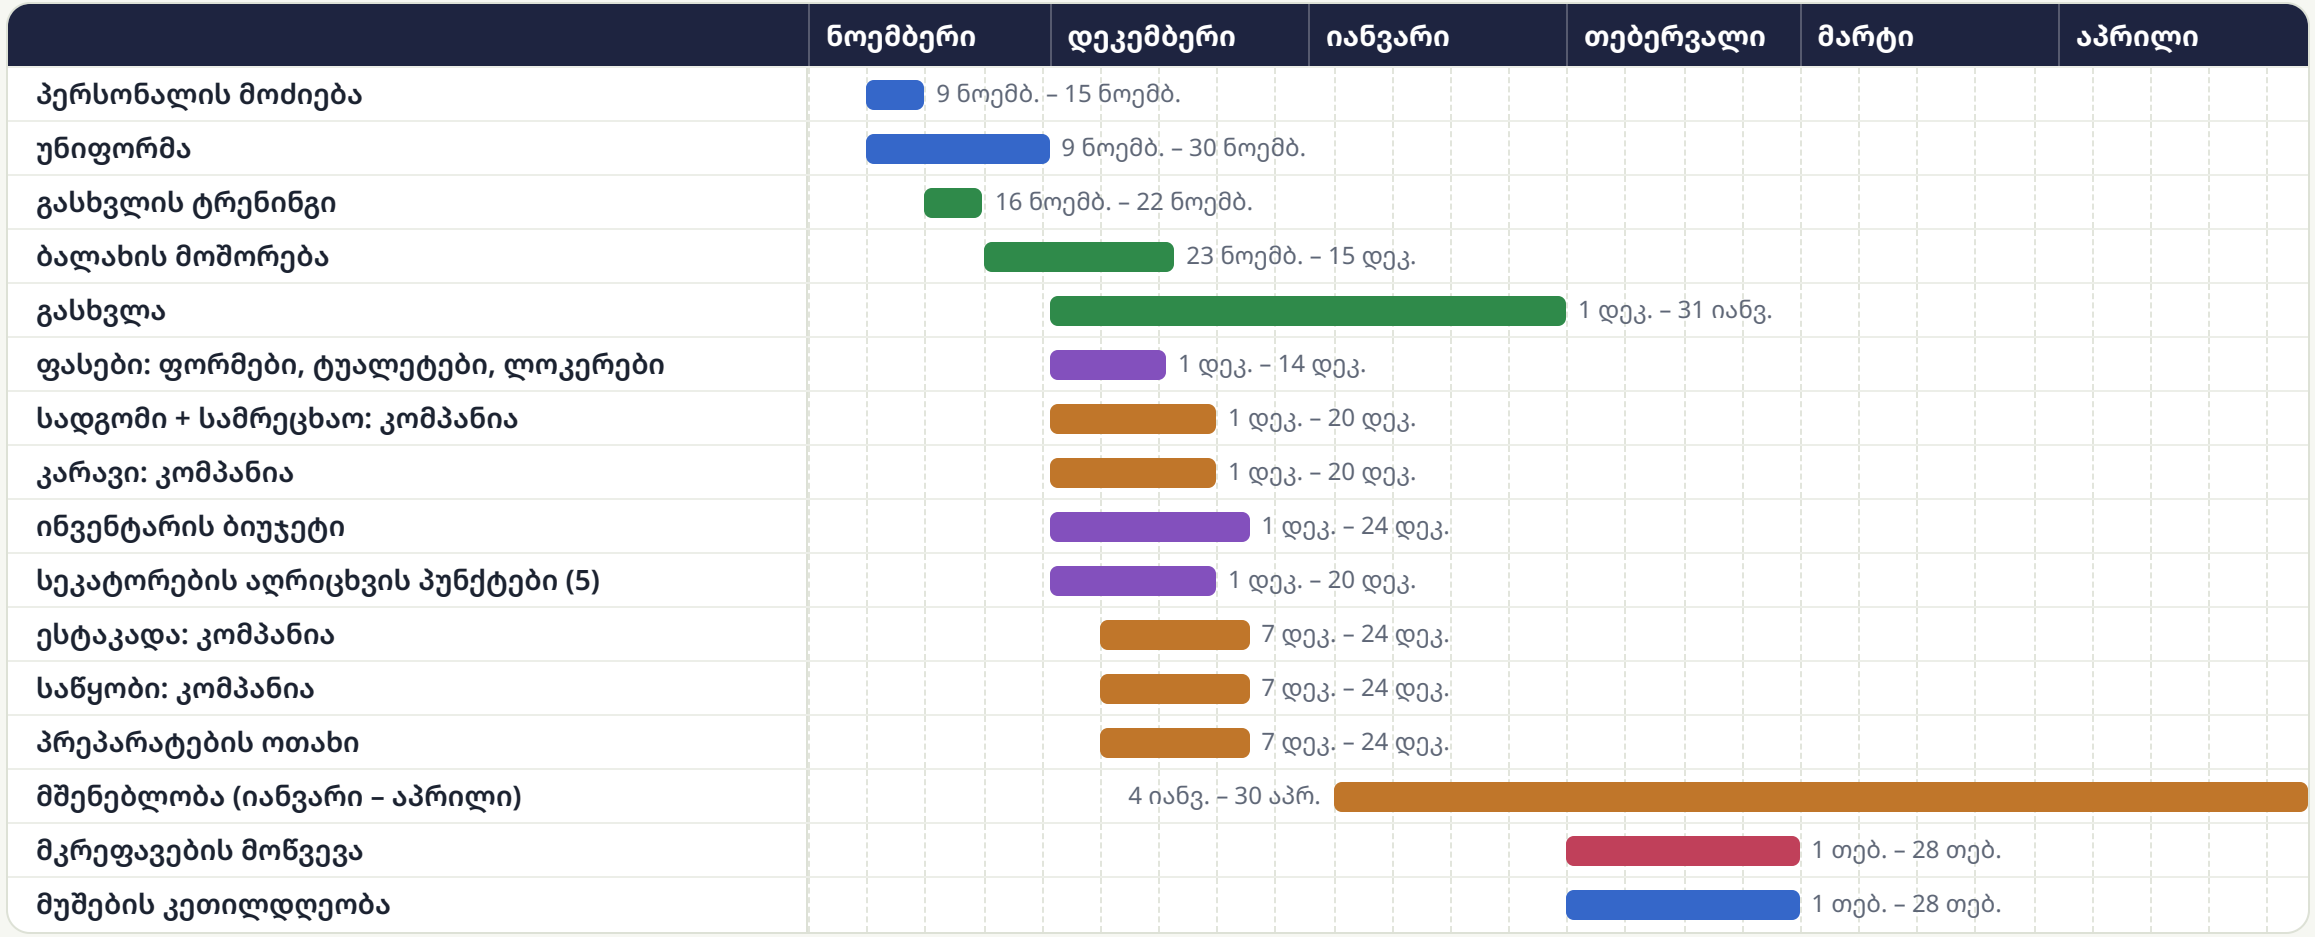

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება

9 ნოემბ. – 15 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: დირექტორი

- საჭირო პოზიციების და რაოდენობის განსაზღვრა
- ვაკანსიის გავრცელება
- გასაუბრებები
- შერჩეულ კანდიდატებთან ხელშეკრულებები
- სიის შედგენა (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება

9 ნოემბ. – 30 ნოემბ.

პერსონალი

- ზომების შეგროვება
- ზაფხულის მაისური (მოკლე სახელო, თეთრი)
- ზამთრის მაისური (გრძელი სახელო, მოცვისფერი)
- ქურთუკი (წყალგაუმტარი, ამრეკლი ზოლებით)
- მომწოდებლის შერჩევა
- ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება

+ კიდევ 1

ტრენინგი თანამშრომლებისთვის გასხვლაზე

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- გასხვლის წესები მოცვზე (თეორია)
- პრაქტიკა ნაკვეთზე
- სეკატორების გამოყენება და დეზინფექცია
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ბალახის მოშორების პროცესი

23 ნოემბ. – 15 დეკ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

დეკემბერი 2026: გასხვლა და შესყიდვები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება

1 დეკ. – 31 იანვ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება

1 დეკ. – 24 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი · პასუხისმგებელი: დირექტორი

- სასწორები
- სეკატორები (ფანცატურები)
- კომპიუტერები
- სამედიცინო ურნები
- გენერატორები
- ავეჯი

+ კიდევ 1

კომპანიების მოძიება და ფასების დადგენა: ფორმები, ტუალეტები, აბაზანა/საშხაპე, შესანახი ლოკერები

1 დეკ. – 14 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- ფორმები (უნიფორმა)
- ბიოტუალეტები
- აბაზანა / საშხაპე / ხელსაბანი
- შესანახი ლოკერები
- კომპანიების ნახვა ადგილზე
- ფასების შედარების ცხრილი

კომპანიის მოძიება: გადასატანი პუნქტები სეკატორების (ფანცატურების) გაცემა-აღრიცხვისთვის (მინ. 5)

1 დეკ. – 20 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- გადასატანი ჯიხური ან ურიკა სახურავით (მზისა და წვიმისგან)
- სავარძელი და მაგიდა აღრიცხველისთვის
- ჩასაკეტი ყუთი სეკატორებისთვის (ნომერირებული ბუდეები)
- ტაბლეტი ან ტელეფონი: გაცემა-დაბრუნება QR-ით AgroInTechSol-ში
- სეკატორების დეზინფექციის ჭურჭელი და სალუსი
- მინიმუმ 5 პუნქტი, 3 კომპანიის შეთავაზება

დეკემბერი 2026: ინფრასტრუქტურის კომპანიები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

კომპანიის მოძიება: ავტოსადგომი გადახურვით + Kärcher სამრეცხაო

1 დეკ. – 20 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- სადგომის ზომა და ადგილი
- გადახურვის ტიპი
- Kärcher სამრეცხაოს წერტილი (წყალი, დრენაჟი, დენი)
- 3 კომპანიის შეთავაზება

კომპანიის მოძიება: დიდი კარავი სასადილოსა და დასასვენებლად, ინფრასტრუქტურით

1 დეკ. – 20 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- კარვის ზომა მკრეფავების რაოდენობაზე
- მაგიდები და სკამები
- ვენტილატორები / განათება / დენი
- საკვების ზონა

+ კიდევ 1

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა)

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- გაზომვები
- ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- თაროები / სტელაჟები
- შეთავაზებები

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- ვენტილაცია
- თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- ცეცხლმაქრი

+ კიდევ 4

იანვარი – აპრილი 2027

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

4 იანვ. – 30 აპრ.

ინფრასტრუქტურა

- ავტოსადგომი გადახურვით + სამრეცხაო
- სასადილო / დასასვენებელი კარავი
- ტუალეტები, აბაზანა, ხელსაბანი
- ლოკერები
- სამაცივრის ესტაკადა
- ყუთების საწყობი + პრეპარატების ოთახი

+ კიდევ 1

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მკრეფავების მოწვევა, მიმდინარე სამუშაოების ჩვენება და სიების გავლა

1 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები

- მკრეფავების მოწვევა
- მიმდინარე მშენებლობის ჩვენება: რა იქნება სეზონისთვის
- სიების გადამოწმება

მუშების კეთილდღეობა და უსაფრთხოება


1 თებ. – 28 თებ.

პერსონალი

- სიცხის გეგმა: წყალი, ჩრდილი, შესვენებების გრაფიკი
- სასმელი წყლის წერტილები სექტორებში
- პირველადი დახმარების ყუთები (თითო ბრიგადაზე)
- პირველადი დახმარების ტრენინგი ბრიგადირებისთვის
- საგანგებო ტელეფონები და უახლოესი სამედიცინო პუნქტი დაფაზე
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი ხელმოწერით ყველა თანამშრომლისთვის

+ კიდევ 2

ტერიტორია: განლაგება

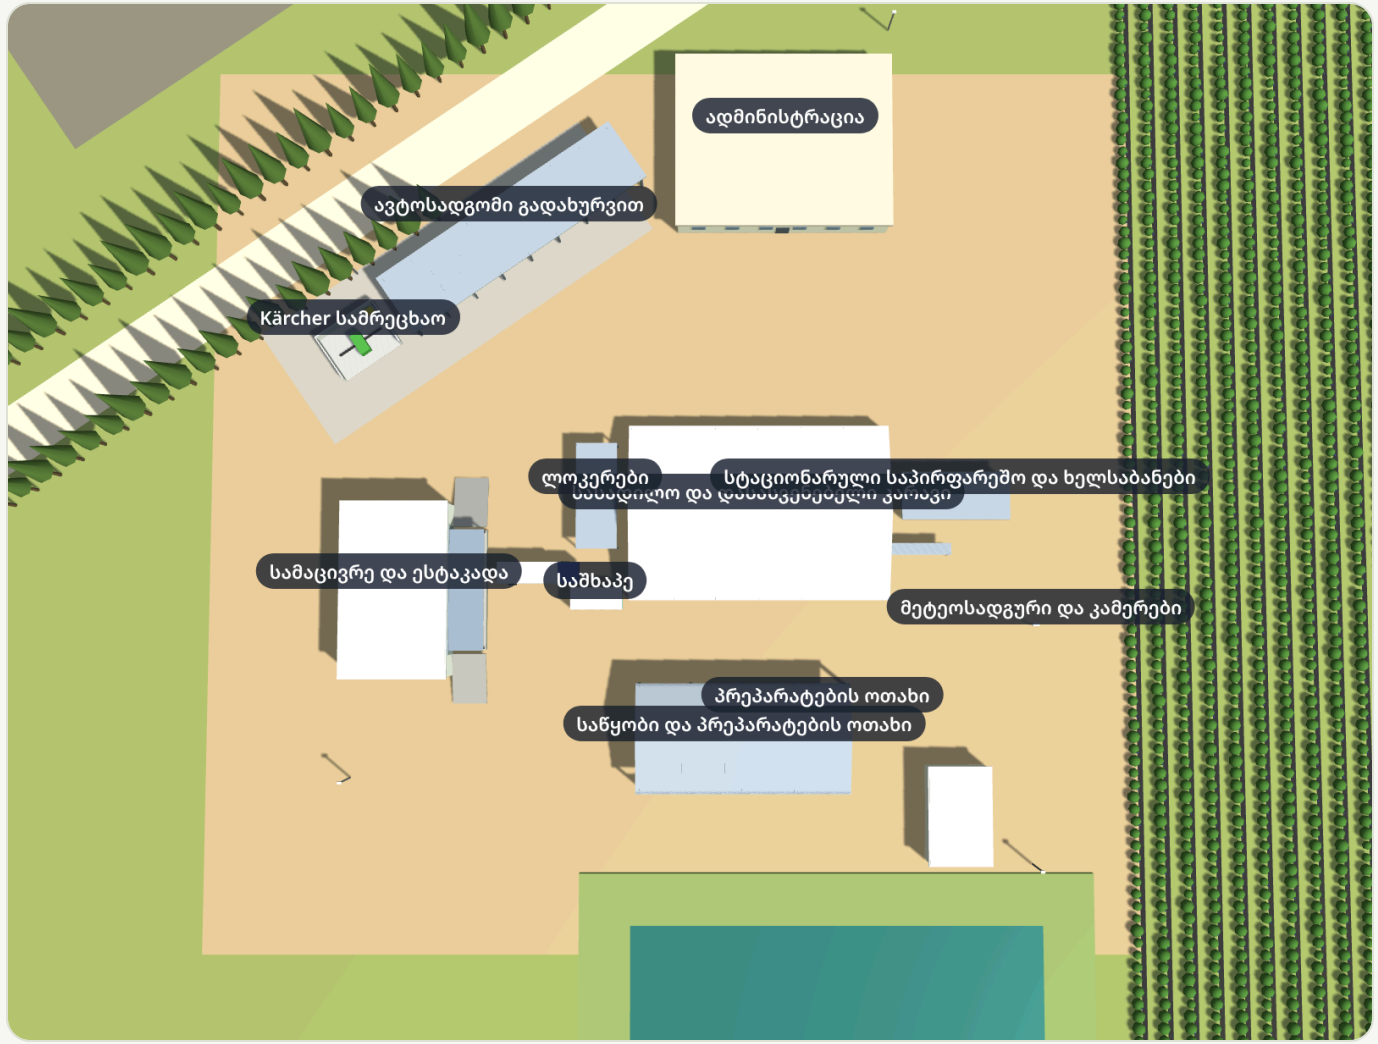

ადმინისტრაცია ჩრდილოეთით, გზიდან შესასვლელთან.

სადგომი და Kärcher-სამრეცხაო ხრეშიან ადგილზე, გზის გასწვრივ.

სამაცივრე (არსებული) ადმინისტრაციის სამხრეთ-დასავლეთით, ახალი ესტაკადით.


კარავი ეზოს შუაში, გვერდით ლოკერები, საშხაპე და სტაციონარული საპირფარეშო.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი ერთი გადახურვის ქვეშ, აუზის ზემოთ.

პლანტაცია აღმოსავლეთით.

ავტოსადგომი და სამრეცხაო

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 1–20 დეკემბერი, მშენებლობა იანვარში

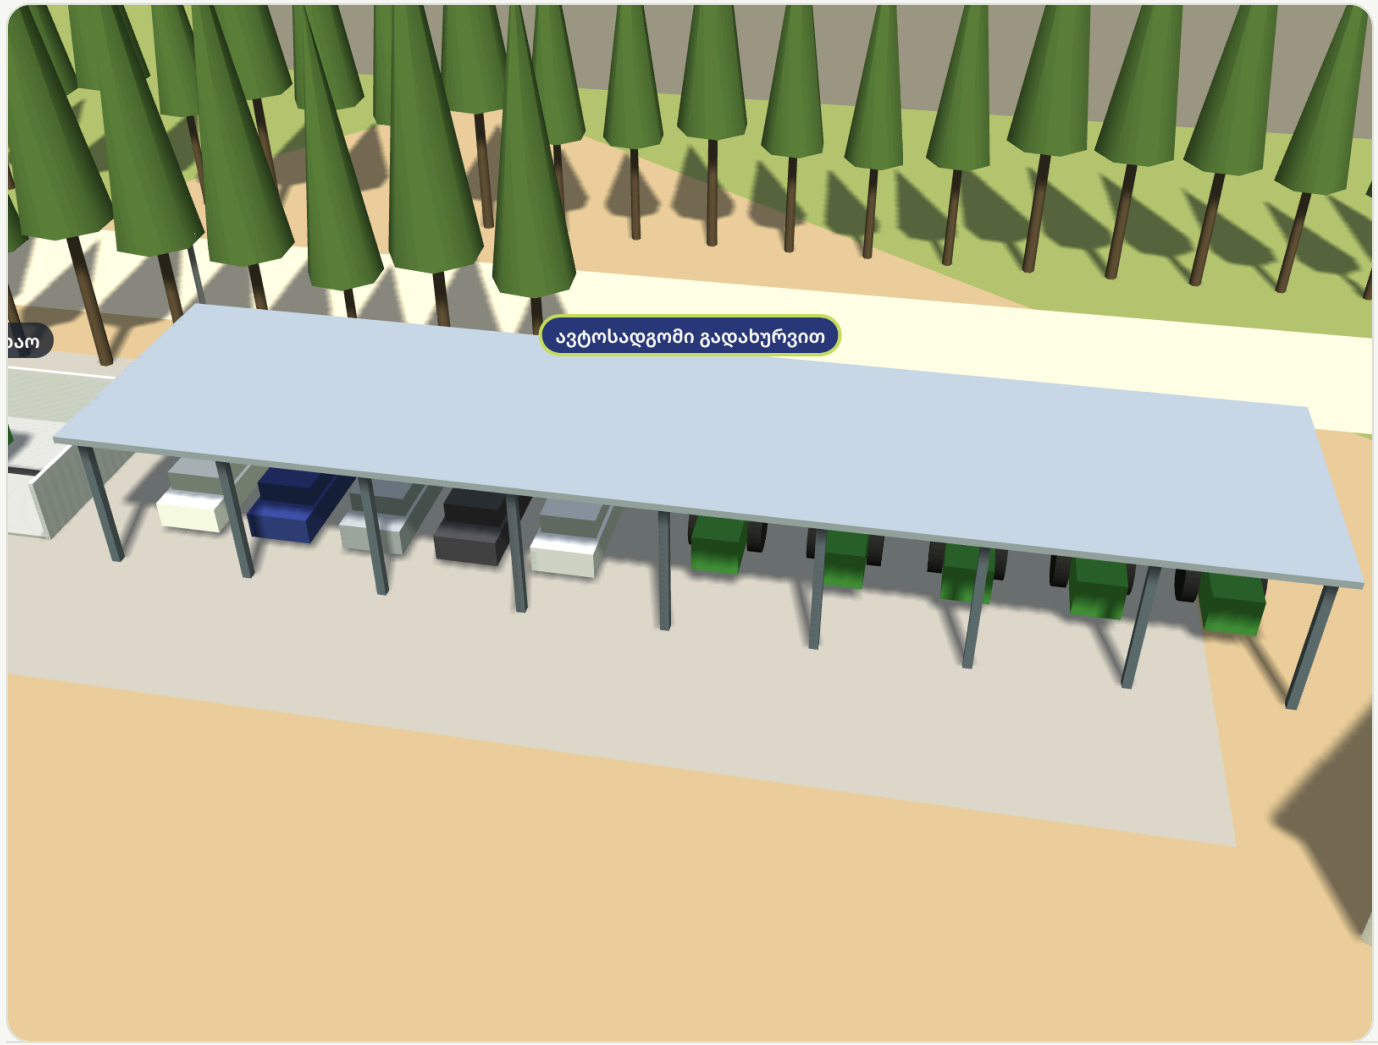

სადგომი ≈ 32 × 7 მ: 5 ავტომობილი და 5 ტრაქტორი, სიმაღლე ≈ 4.2 მ.

ეზოს მხარეს, გზისა და ხეებისგან მოშორებით.


ლითონის კონსტრუქცია, პროფნასტილის გადახურვა.

Kärcher-სამრეცხაო ≈ 8 × 6 მ: ბეტონის ბაქანი დახრით, დრენაჟი და ზეთდამჭერი. საჭიროა წყალი და დენი 380V.

განათება, კამერა, ცეცხლმაქრი.

სამაცივრე და ესტაკადა

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 7–24 დეკემბერი

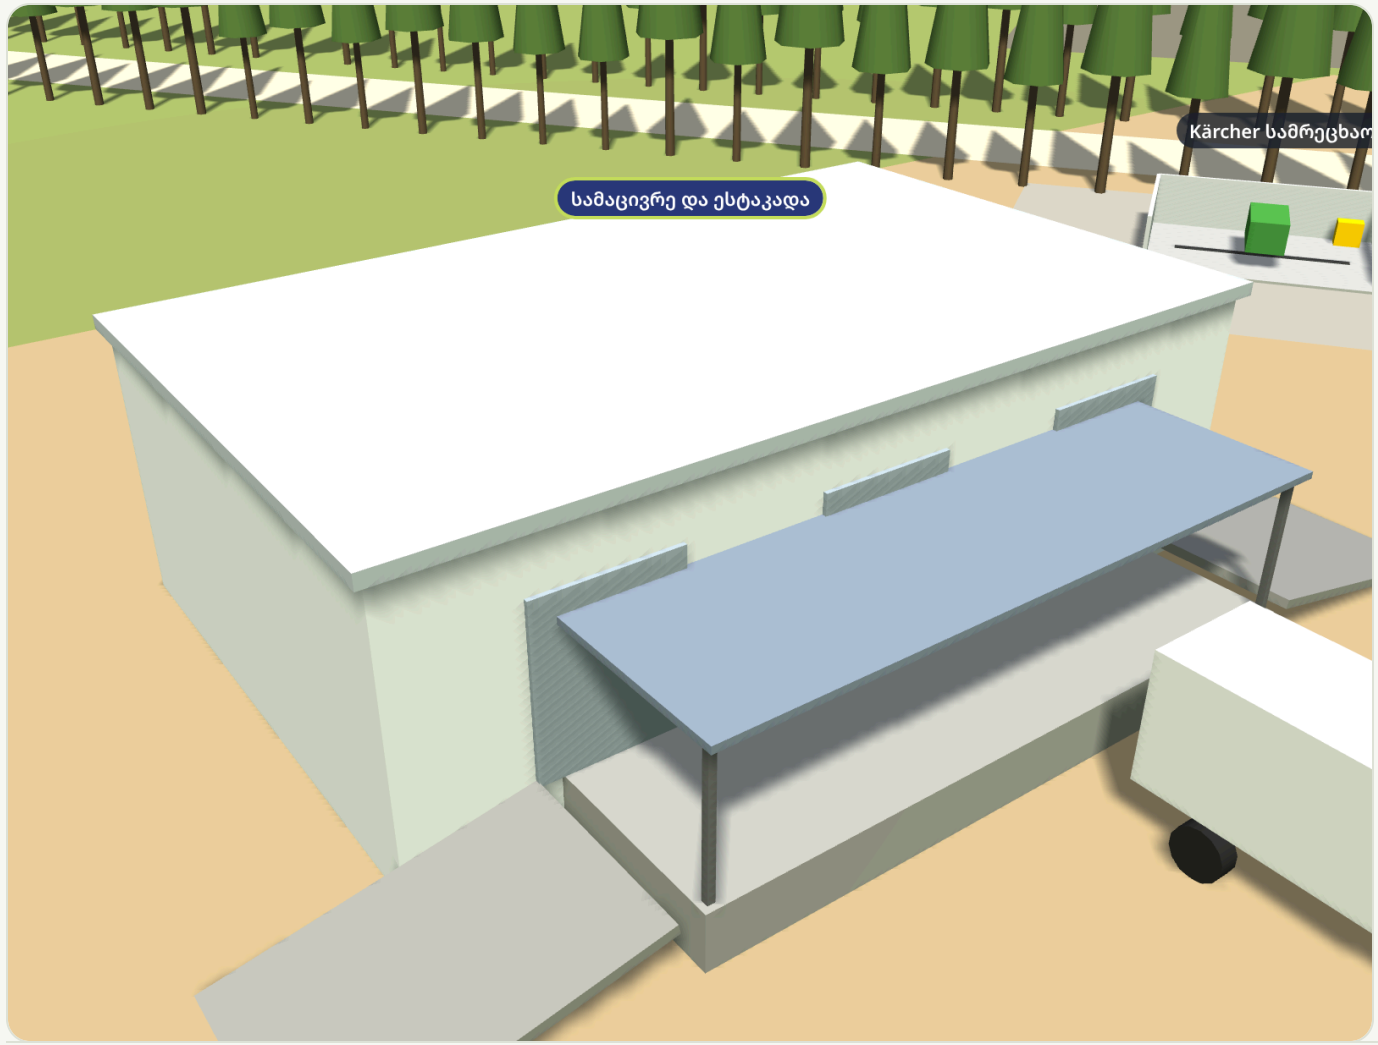

სამაცივრე უკვე დგას, მასში ინახება მოცვი.


ესტაკადა ≈ 12 × 4 მ: ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე (1.2 მ), სახურავით.

პანდუსები ორივე ბოლოში: ერთზე ადიან, მეორეზე ჩამოდიან.

რეზინის ბამპერები, მოაჯირი, განათება.

სასადილო და დასასვენებელი კარავი

გეგმაში: კომპანიის მოძიება 1–20 დეკემბერი

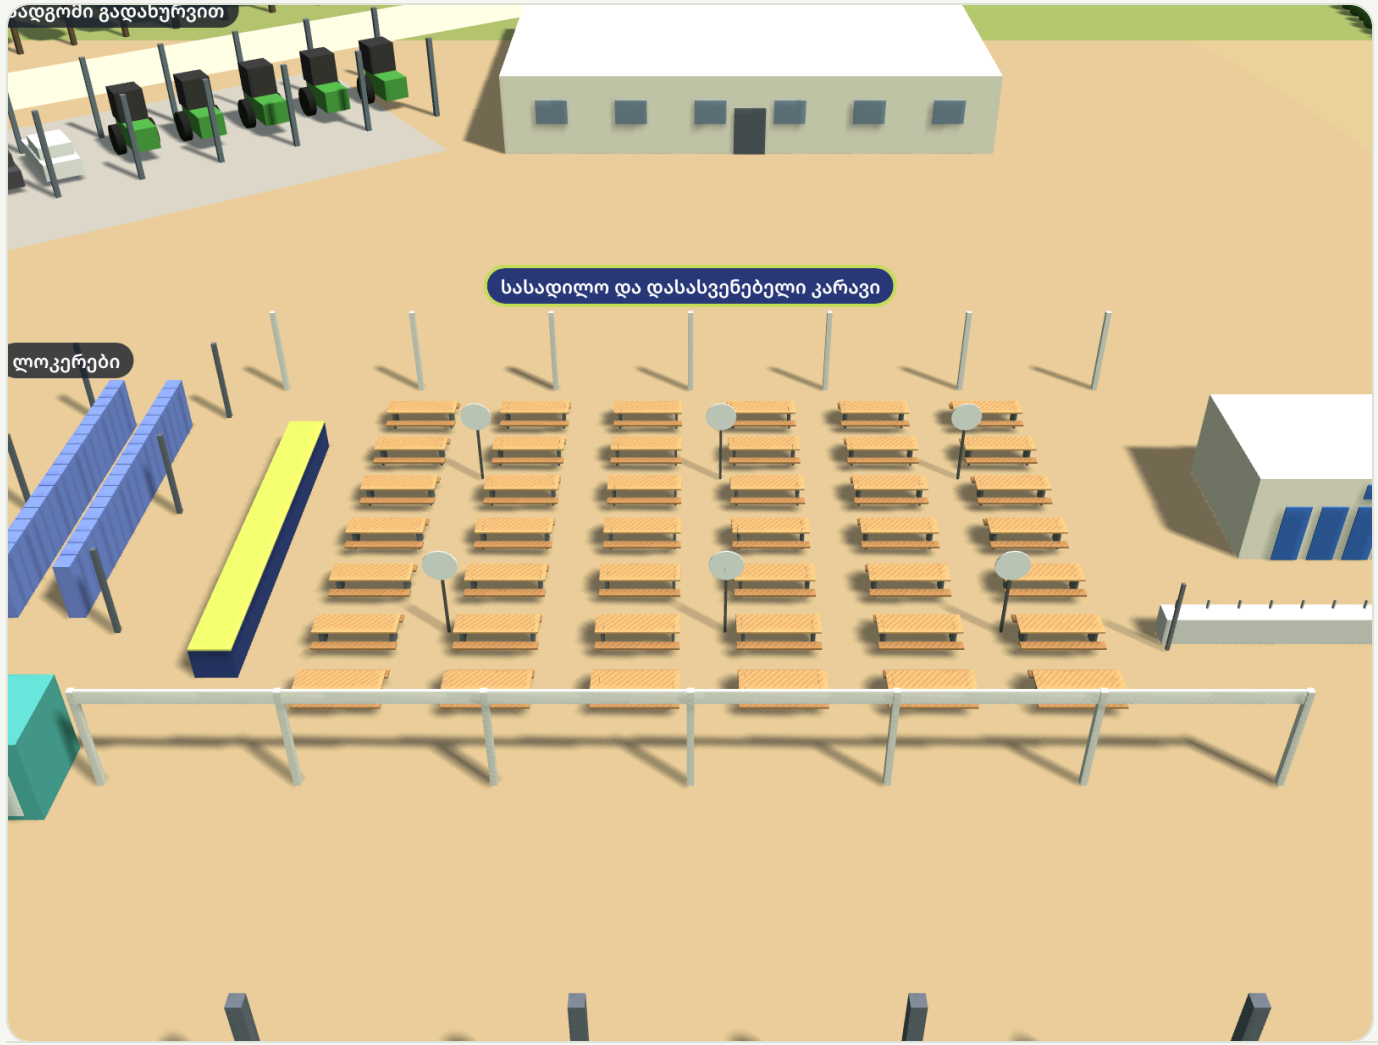

≈ 30 × 20 მ (600 მ²), ≈ 300 ადგილი. 500 კაცი ჭამს 2 ცვლად.

ვენტილატორები, განათება, საკვების გაცემის ზონა, წყლის დისპენსერები.

ასაწევი გვერდები ჰაერისთვის.

გვერდით: **36 ლოკერი** ფარდულის ქვეშ და **საშხაპე** 4 კაბინით.

საპირფარეშო და ხელსაბანები

კარვის გვერდით, გარეთ, სტაციონარული



შენობა ≈ 12 × 5 მ: ≈ 10 ქალთა და 10 მამაკაცთა კაბინა, ცალკე შესასვლელით.


10 ონკანიანი ხელსაბანი გარედან, ტუალეტსა და კარავს შორის.

წყალი და კანალიზაცია (ან სეპტიკი), განათება.

დასუფთავების გრაფიკი და პასუხისმგებელი პირი.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი

ერთი გადახურვის ქვეშ · გეგმაში: 7–24 დეკემბერი

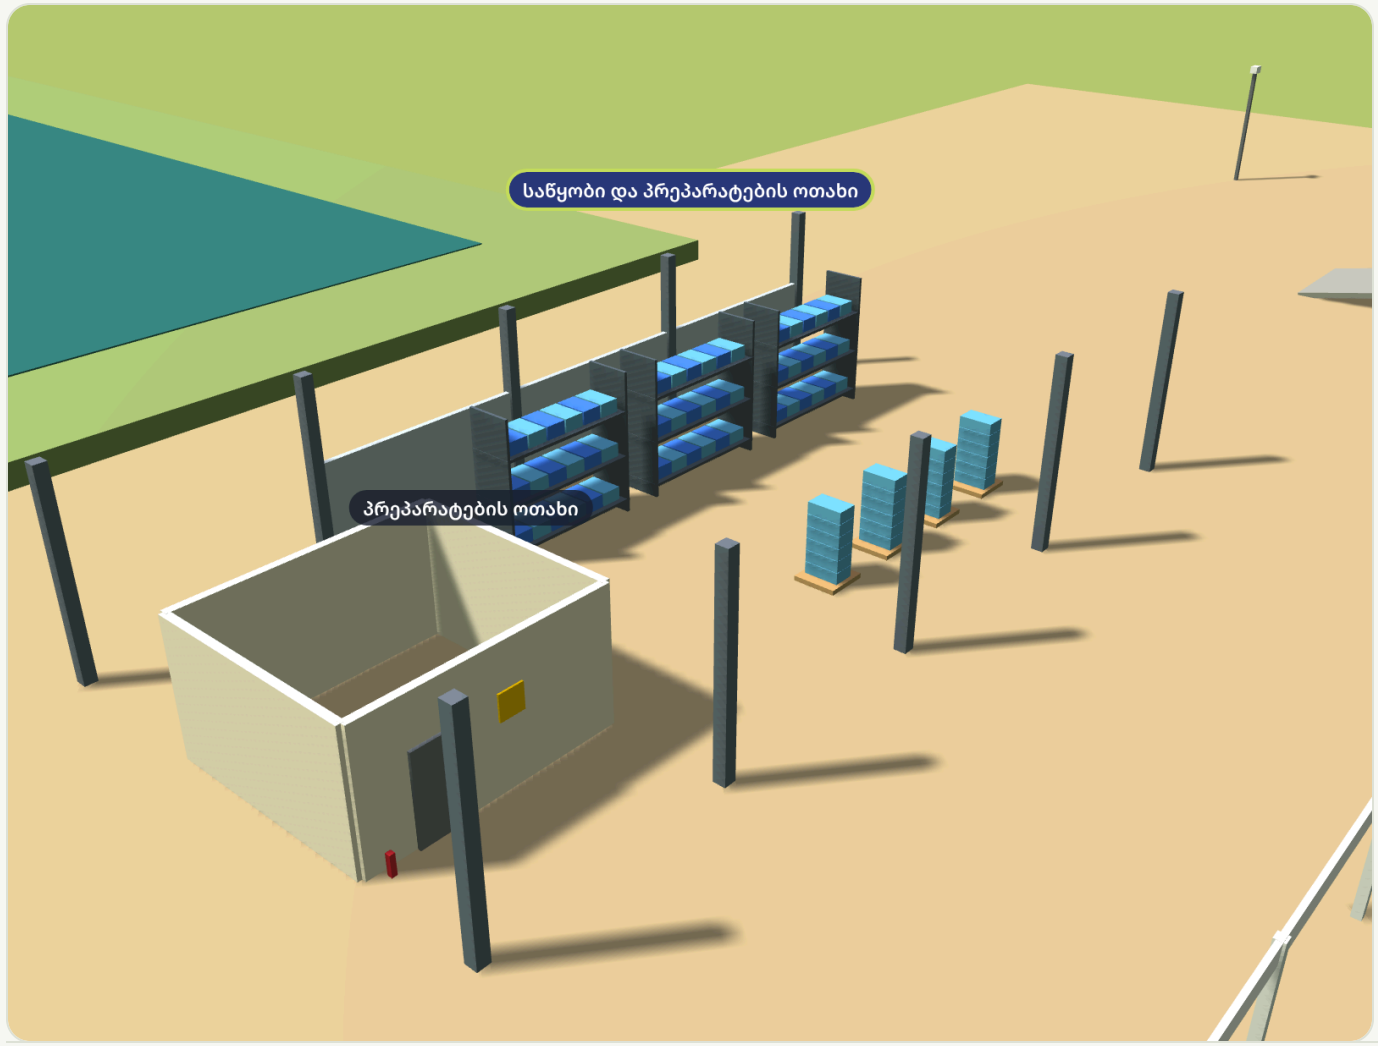

საწყობი ≈ 24 × 12 მ: ყუთები, პალეტები და ინვენტარი, მეტალის სტელაჟები 3 იარუსად.

პრეპარატების ოთახი ≈ 6 × 5 მ: ჩაკეტილი, ვენტილაციით.

ლითონის თაროები, ჩამოღვრის ტაფები, ცეცხლმაქრი, დაცვის საშუალებები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, თვალის სარეცხი.

პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი, შესვლა მხოლოდ პასუხისმგებელ პირს.

უნიფორმა

წინ ლოგო, უკან კომპანიის სახელი · 9–30 ნოემბერი

ზაფხულის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ზამთრის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ქურთუკი



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ინვენტარის ბიუჯეტი

ფასები: დეკემბერში, შეთავაზებების შემდეგ

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)
სასწორები		—	—
სეკატორები (ფანცატურები)		—	—
კომპიუტერები		—	—
სამედიცინო ურნები		—	—
გენერატორები		—	—
ავეჯი		—	—
გადასატანი პუნქტი სეკატორების აღრიცხვისთვის	სახურავით, სავარძლით და ჩასაკეტი ყუთით	5	—
პირველადი დახმარების ყუთები	თითო ბრიგადაზე	8	—

მფლობელებთან შესათანხმებელი

1. **გეგმის დამტკიცება:** ეტაპები და ვადები ნოემბრიდან თებერვლამდე.
2. **ინფრასტრუქტურის განლაგება:** სადგომი, კარავი, საპირფარეშო, საწყობი და პრეპარატების ოთახი რუკის მიხედვით.
3. **ბიუჯეტი:** დეკემბერში, 3 კომპანიის შეთავაზების შედარებით, ცალკე დამტკიცება.
4. **უნიფორმის დიზაინი** და რაოდენობა.
5. **მარტი–აპრილი:** შემდეგი ეტაპის დაგეგმვა (აყვავება, ფუტკარი, მოსავლის მზადება).
