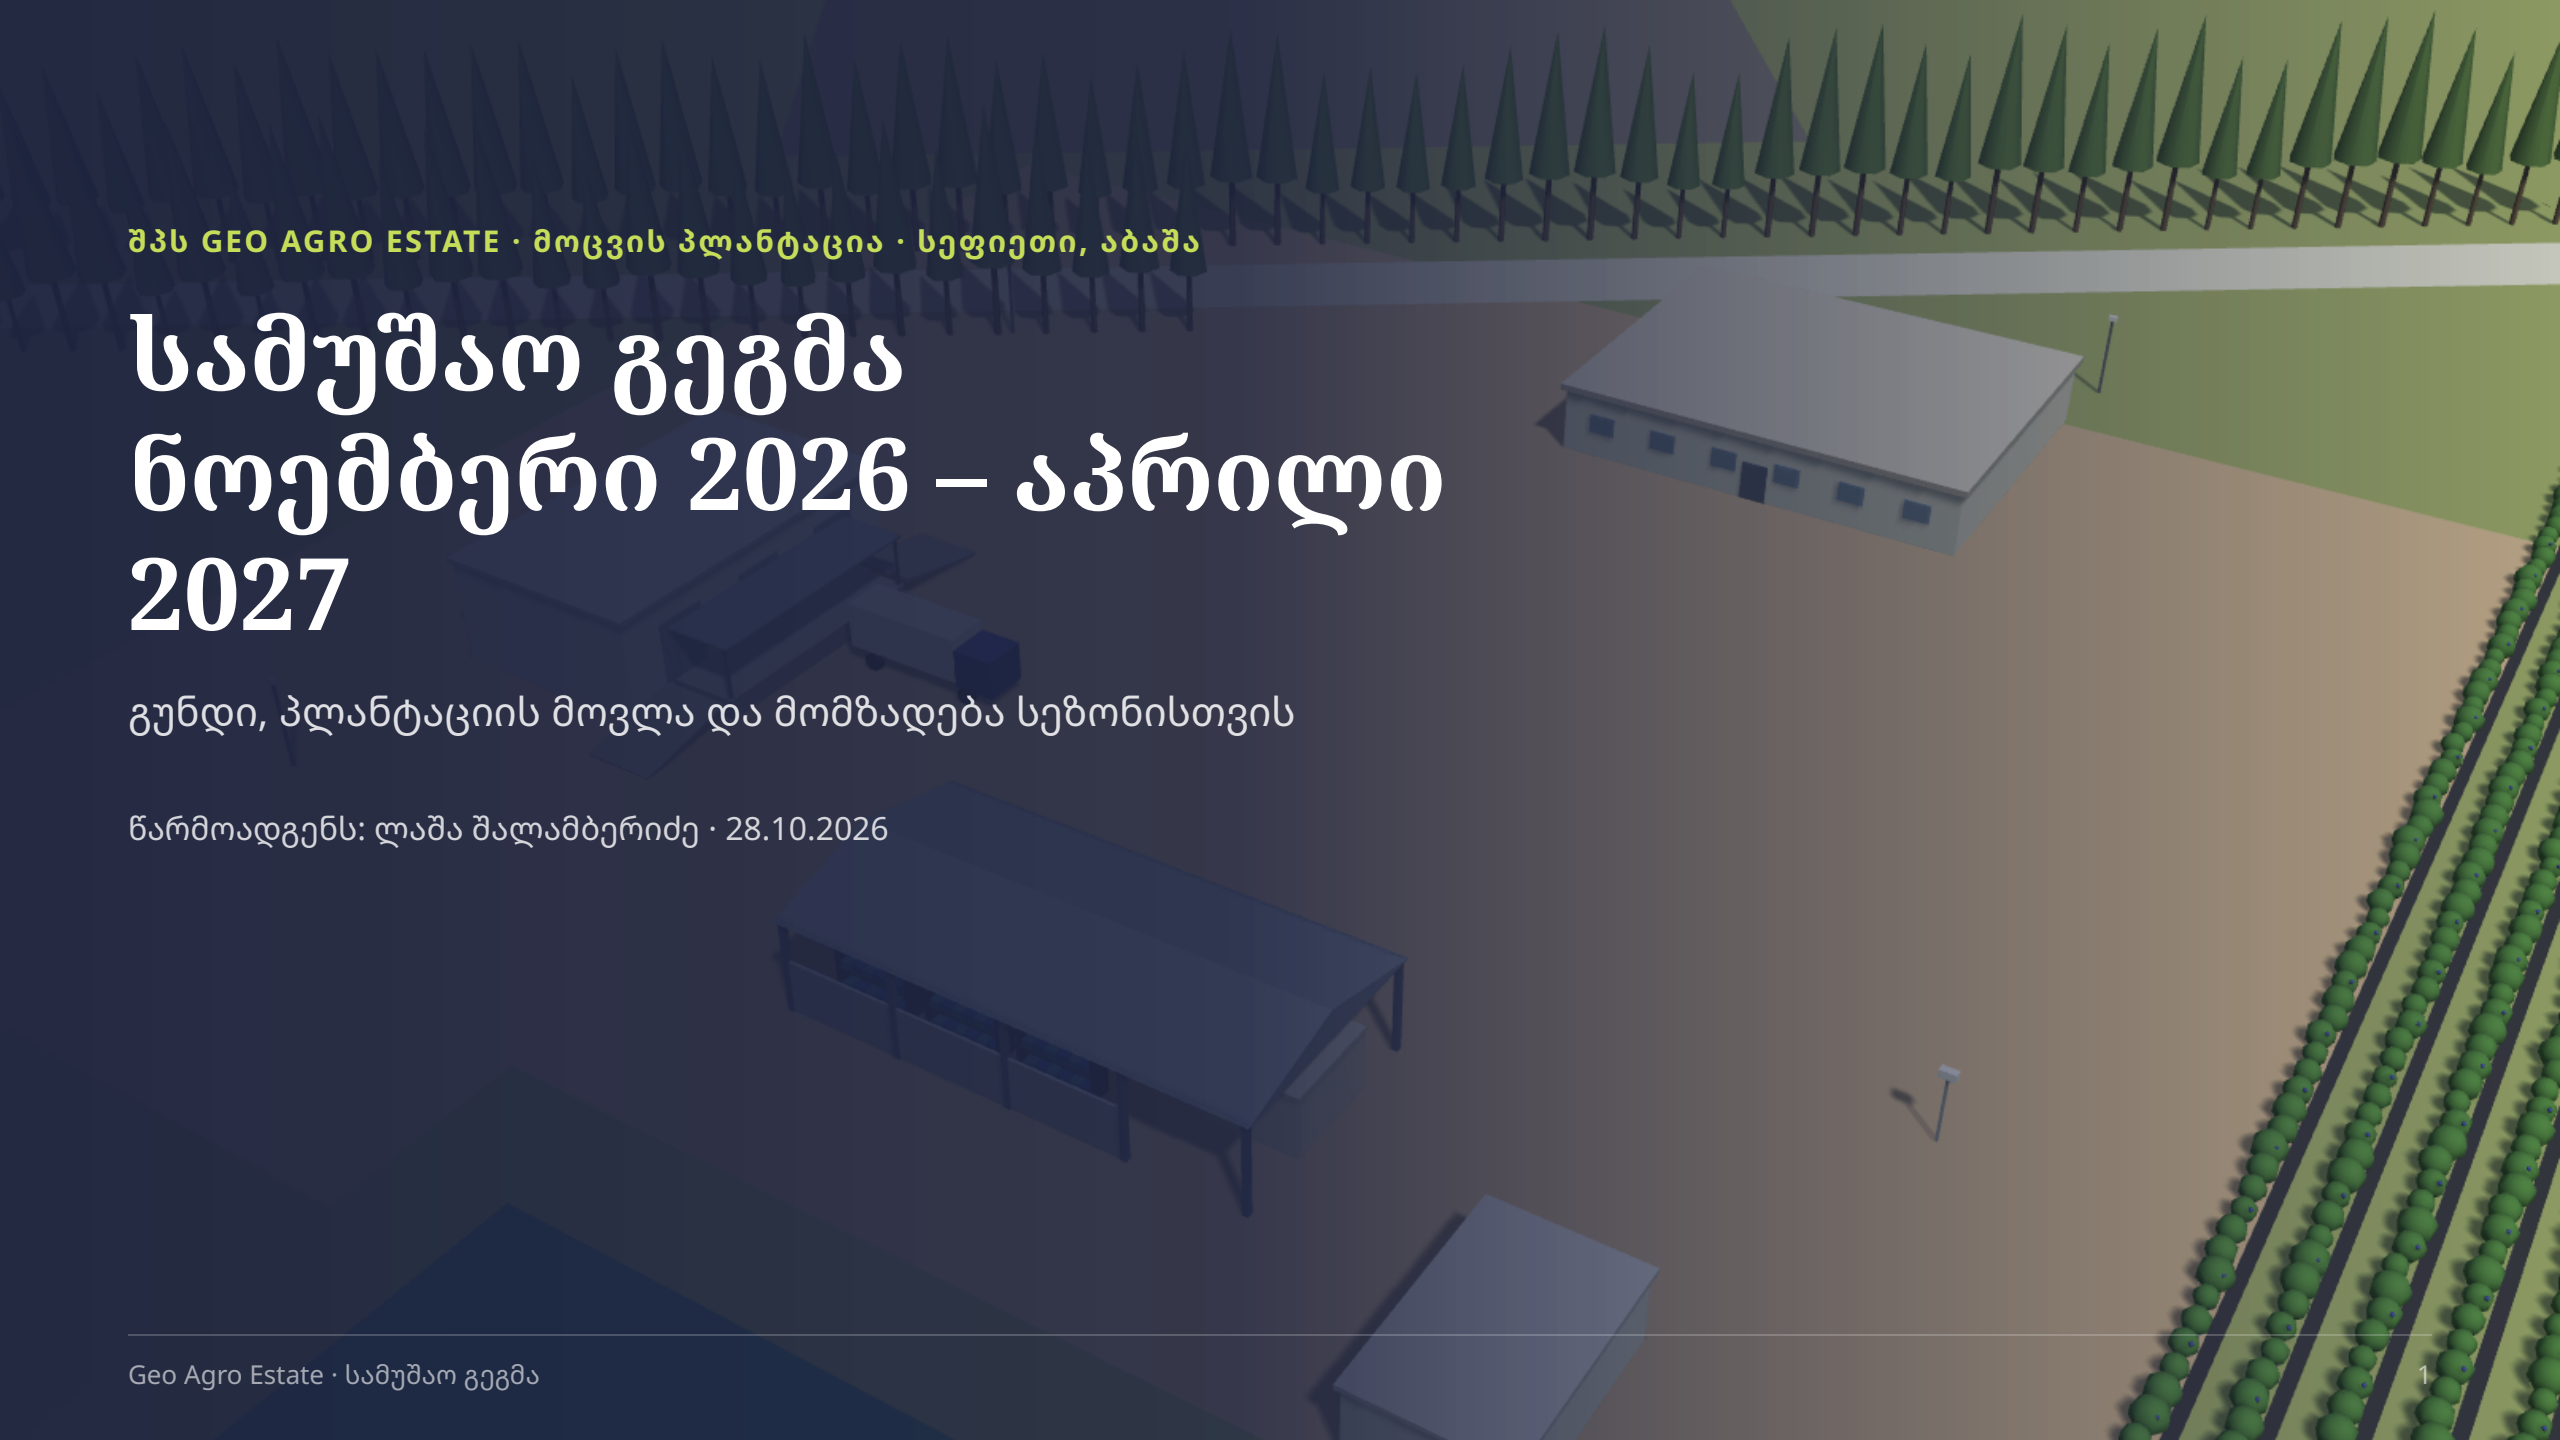


შპს GEO AGRO ESTATE · მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა

სამუშაო გეგმა ნოემბერი 2026 – აპრილი 2027

გუნდი, პლანტაციის მოვლა და მომზადება სეზონისთვის

წარმოადგენს: ლაშა შალამბერიძე · 28.10.2026

მიზანი

სეზონის დაწყებისთვის კომპანიას უნდა ჰქონდეს გაწვრთნილი გუნდი, მოწესრიგებული პლანტაცია, საკმარისი მკრეფავები და მზა სამუშაო პირობები.

1

გუნდი

სტრუქტურა და 21 სექტორის მენეჯერი, ტრენინგები, ერთიანი უნიფორმა, უსაფრთხოება.

2

პლანტაცია

გასხვლა 1 დეკემბრიდან 31 იანვრამდე, წამლობა და მოვლა.

3

სეზონი

მოძრავი პუნქტები, საწყობი, სამაცივრის ესტაკადა, ბიოტუალეტების იჯარა, მკრეფავების მოზიდვა, შემსყიდველების კონფერენცია.

500 მკრეფავი მაქსიმუმ

21 სექტორი

4–5 მოძრავი პუნქტი

AgroInTechSol აღრიცხვა: QR, სასწორი, რეპორტები

სტრუქტურა


დირექტორი
აგრონომია
აგრონომი
აგრონომის თანაშემწე
საველე სამუშაოები
მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი
სექტორის მენეჯერები
21
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21
საველე კადრების მენეჯერი
მკრეფავებზე პასუხისმგებელი
მკრეფავები
≤ 500
საწყობი და სამაცივრე
საწყობის მენეჯერი
საწყობი და ტექნიკა
სამაცივრის პასუხისმგებელი
ადმინისტრაცია
ადმინისტრატორი
დაცვა

ეტაპები

ეტაპი 1

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

დაკომპლექტებული, გაწვრთნილი და ფორმიანი გუნდი.

4 ამოცანა

ეტაპი 2

დეკემბერი 2026

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის დაწყება (იანვრის ბოლომდე); შერჩეული კომპანიები, ფასები და ინვენტარის ბიუჯეტი.

8 ამოცანა

ეტაპი 3

იანვარი – აპრილი 2027

საწყობი და მკრეფავები

საწყობი და პრეპარატების ოთახი, მოძრავი პუნქტები, მკრეფავების მოზიდვა; დასრულება აპრილის ბოლომდე.

3 ამოცანა

ეტაპი 4

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მოწვეული მკრეფავები, ნაჩვენები მიმდინარე სამუშაოები, გადამოწმებული სიები.

2 ამოცანა

ეტაპი 5

მარტი 2027


გაყიდვები

შემსყიდველებისა და ქსელების ხელმძღვანელების კონფერენცია, 2-დღიანი ტური საქართველოში.

1 ამოცანა

გრაფიკი

პერსონალი · აგრო-სამუშაოები · ინფრასტრუქტურა · შესყიდვები / ბიუჯეტი · მოსავალი / მკრეფავები · გაყიდვები

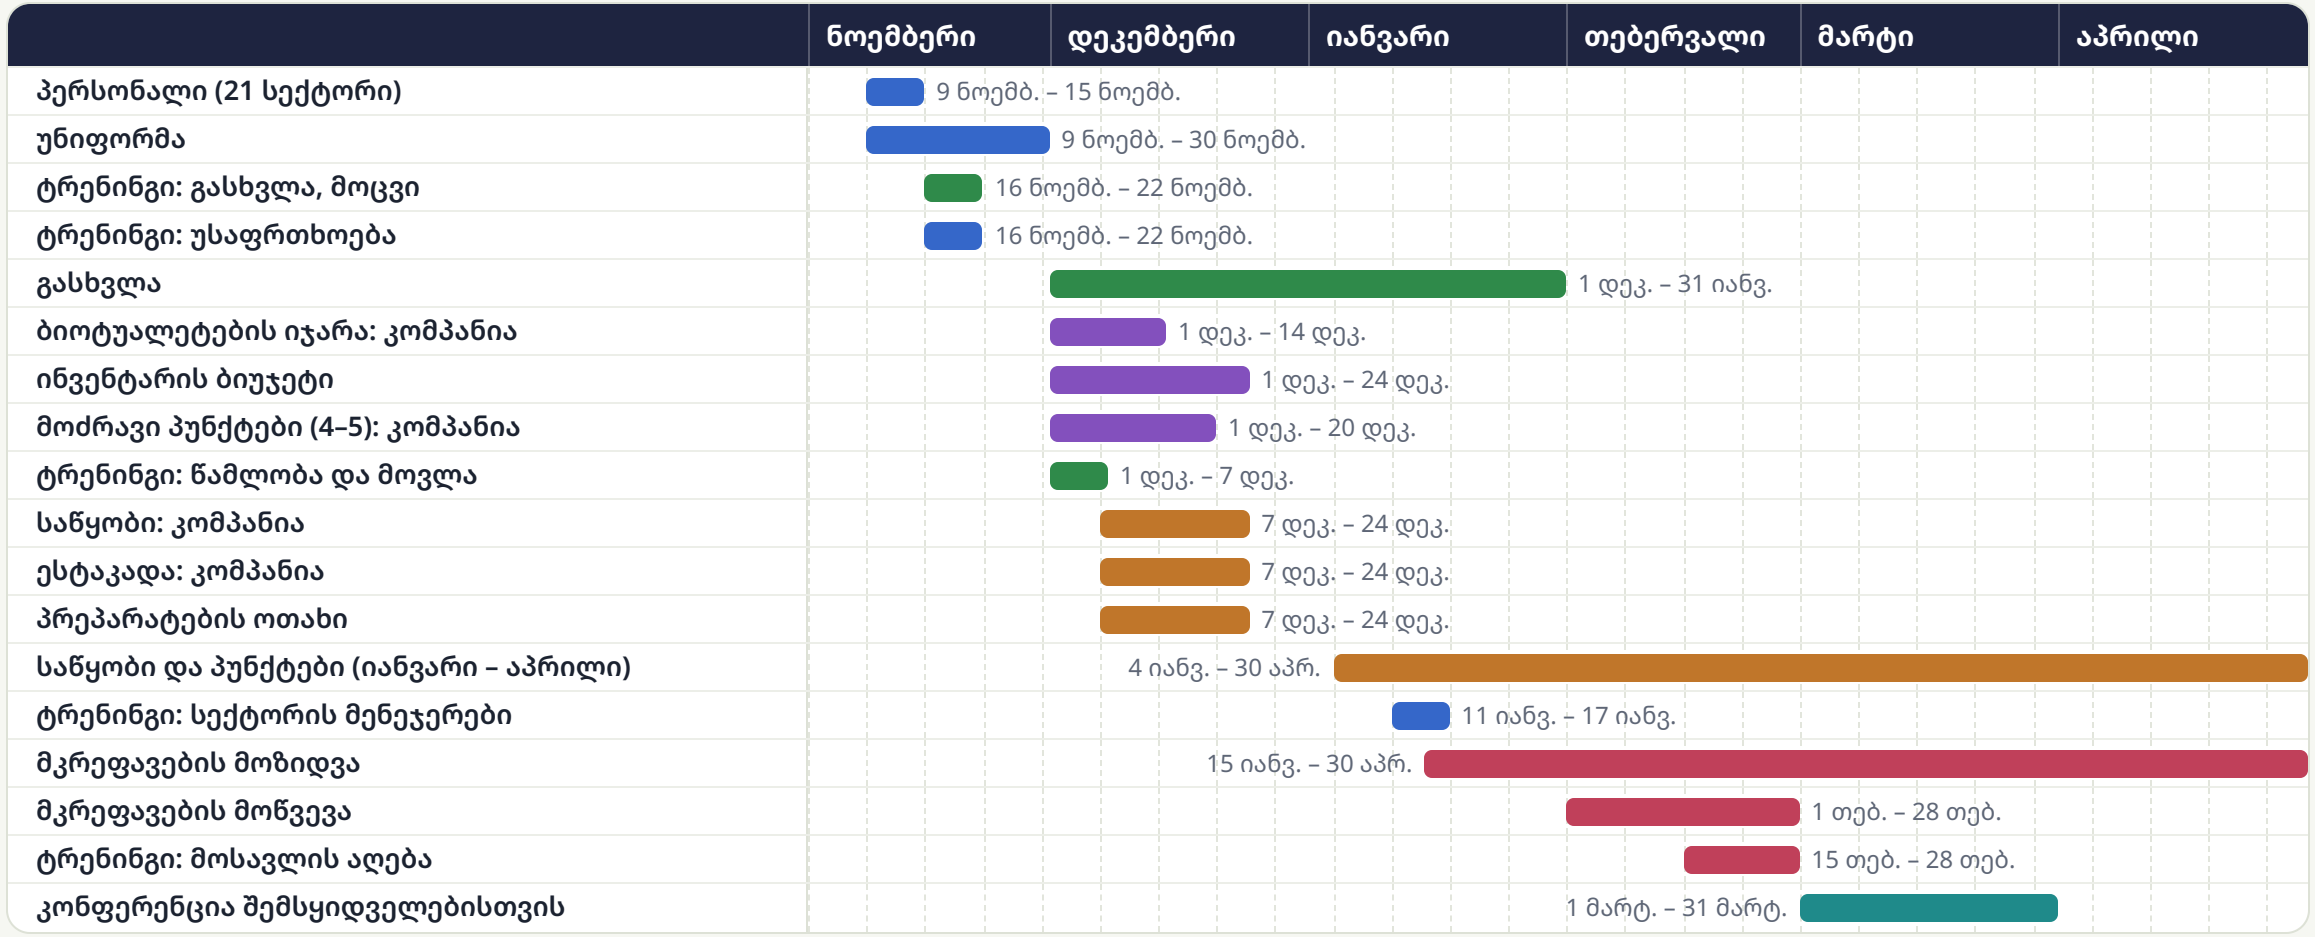

ნოემბერი 2026

გუნდის შეკრება და მომზადება

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება სექტორების მიხედვით (21 სექტორი)

9 ნოემბ. – 15 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- სექტორების ჩამონათვალი: 21 სექტორი (ნომერი, საზღვრები, ფართობი)
- სექტორის მენეჯერები: 21, თითო სექტორზე
- მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი (21 სექტორის მენეჯერზე)
- აგრონომი და აგრონომის თანაშემწე
- საველე კადრების მენეჯერი (მკრეფავებზე პასუხისმგებელი)
- საწყობის მენეჯერი (საწყობი და ტექნიკა)
- სამაცივრის პასუხისმგებელი პირი
- ადმინისტრატორი
- დაცვა
- მუშების რაოდენობა თითო სექტორზე
- ვაკანსია, გასაუბრებები, ხელშეკრულებები
- სია სექტორების მიხედვით (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება

9 ნოემბ. – 30 ნოემბ.

პერსონალი

- ზომების შეგროვება
- ზაფხულის მაისური (მოკლე სახელო, თეთრი)
- ზამთრის მაისური (გრძელი სახელო, მოცვისფერი)
- ქურთუკი (წყალგაუმტარი, ამრეკლი ზოლებით)
- მომწოდებლის შერჩევა
- ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება
- შეკვეთა და დარიგება

ტრენინგები: ნოემბერი

16–22 ნოემბერი

ტრენინგი: გასხვლა და მოცვის საფუძვლები

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- მოცვი: რა არის მოცვი, ჯიშები, ზრდის ციკლი
- მოცვის მოთხოვნები: ნიადაგი (pH 4.5–5.5), წყალი, მულჩი
- გასხვლის წესები (თეორია)
- გასხვლის პრაქტიკა ნაკვეთზე, სექტორების მიხედვით
- სეკატორების გამოყენება, დეზინფექცია და აღრიცხვა
- უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ტრენინგი: შრომის უსაფრთხოება და პირველადი დახმარება

16 ნოემბ. – 22 ნოემბ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ადმინისტრატორი/HR

- ტერიტორიის წესები: მოძრაობა ეზოში, ტექნიკასთან და ავტომობილებთან
- ხელსაწყოების უსაფრთხო გამოყენება (სეკატორები, დანები, კიბეები)
- მუშაობა სიცხეში და სიცივეში: წყალი, ჩრდილი, შესვენება, ტანსაცმელი
- პირველადი დახმარება: ჭრილობა, სიცხის დარტყმა, ალერგია, მოწამვლა
- ცეცხლსაქრობები და ევაკუაციის გეგმა
- საგანგებო ტელეფონები, ვის მიმართო
- ინციდენტის შეტყობინება და ჩაწერა
- დასწრების ფურცელი ხელმოწერით

ტრენინგები: დეკემბერი – თებერვალი

წამლობა, სექტორის მენეჯერები, მოსავლის აღება

ტრენინგი: წამლობა და მოცვის მოვლა

1 დეკ. – 7 დეკ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- წამლობა: პრეპარატები, დოზები, ხსნარის მომზადება
- დაცვის საშუალებები: ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე, კომბინეზონი
- ლოდინის ვადა (PHI) და წამლობის ჟურნალი
- შემსხურებლის კალიბრაცია და გარეცხვა
- პრეპარატების ოთახის წესები, ჩამოღვრისას მოქმედება
- მოცვის დაავადებები და მავნებლები: ამოცნობა
- სექტორის მენეჯერები: სექტორის გეგმა და აღრიცხვა AgroInTechSol-ში
- ტესტი და დასწრების ფურცელი ხელმოწერით

ტრენინგი: სექტორის მენეჯერები

11 იანვ. – 17 იანვ.

პერსონალი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- როლი და პასუხისმგებლობა, ვის ექვემდებარება
- დღის გეგმა და სამუშაოს განაწილება სექტორში
- დასწრება და აღრიცხვა AgroInTechSol-ში (QR, რეპორტები)
- ხარისხის კონტროლი სექტორში
- უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სექტორში
- ხალხთან ურთიერთობა, კონფლიქტის მოგვარება
- ყოველკვირეული რეპორტი მთავარ ზედამხედველ მენეჯერს

ტრენინგი: მოსავლის აღება და ჰიგიენა

15 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

- კრეფის ტექნიკა: მხოლოდ მწიფე კენკრა, ფრთხილად, ცვილის შენარჩუნებით
- კრეფა პირდაპირ შეფუთვაში (კლამშელი), არ გადაავსო
- ხარისხის სტანდარტი: რა არ იკრიფება (დაზიანებული, მკვახე, დაჭყლეტილი)
- ჰიგიენა: ხელების დაბანა, სამკაულის გარეშე, ავადმყოფობისას არ მუშაობს
- სავსე ყუთები ჩრდილში და სწრაფად სამაცივრეში
- QR-ბარათი და აწონვა AgroInTechSol-ში
- ანაზღაურება და ხარისხზე მიბმული ბონუსი
- რიგების და სექტორების თანმიმდევრობა

დეკემბერი 2026: გასხვლა და შესყიდვები

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება

1 დეკ. – 31 იანვ.

აგრო-სამუშაოები · პასუხისმგებელი: აგრონომი

ბიოტუალეტების იჯარა სეზონის განმავლობაში: კომპანიის მოძიება

1 დეკ. – 14 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- რაოდენობა (500 მკრეფავზე)
- განთავსება სექტორებთან და პუნქტებთან
- დაცლისა და დასუფთავების გრაფიკი
- იჯარის ვადა: სეზონი
- 3 კომპანიის შეთავაზება

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება

1 დეკ. – 24 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი · პასუხისმგებელი: ლაშა შალამბერიძე

- სასწორები
- სეკატორები (ფანცატურები)
- კომპიუტერები
- სამედიცინო ურნები
- გენერატორები
- ავეჯი
- სეკატორები გასხვლის ინვენტარი

კომპანიის მოძიება: მოძრავი გადაფარებული პუნქტები (4–5)

1 დეკ. – 20 დეკ.

შესყიდვები / ბიუჯეტი

- გადაფარება (სახურავი) მზისა და წვიმისგან
- ბორბლებზე: გადატანა სექტორიდან სექტორზე
- ოპერატორის ადგილი: კომპიუტერი და პრინტერი
- აღრიცხვა AgroInTechSol-ში: სეკატორების გაცემა, კრეფა QR-ით
- მაცივარი წყლისთვის
- გასაშლელი მაგიდები და სკამები შესვენებისა და სადილისთვის
- ჩასაკეტი ყუთი სეკატორებისთვის
- დენი: გენერატორი
- 3 კომპანიის შეთავაზება

დეკემბერი 2026: სამაცივრე და საწყობი

გასხვლა და მომწოდებლების შერჩევა

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- თაროები / სტელაჟები
- შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა)

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- გაზომვები
- ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე, სახურავით
- პანდუსები ორივე ბოლოში: ერთზე ადიან, მეორეზე ჩამოდიან
- 3 კომპანიის შეთავაზება

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

7 დეკ. – 24 დეკ.

ინფრასტრუქტურა

- ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- ვენტილაცია
- თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- ცეცხლმაქრი
- დაცვის საშუალებები (ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე)
- გამაფრთხილებელი ნიშნები და წესების დაფა
- პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი
- ხელსაბანი / თვალის სარეცხი

იანვარი – აპრილი 2027

საწყობი და მკრეფავები

საწყობის მშენებლობა და პუნქტების მომზადება

4 იანვ. – 30 აპრ.

ინფრასტრუქტურა

- საწყობი და პრეპარატების ოთახი
- სამაცივრის ესტაკადა პანდუსებით
- მოძრავი გადაფარებული პუნქტები (4–5): აწყობა და აღჭურვა
- ბიოტუალეტების იჯარის ხელშეკრულება სეზონზე
- ინვენტარის შეძენა ბიუჯეტის მიხედვით

მკრეფავების მოზიდვის სტრატეგია

მიზანი: მაქსიმუმ 500 მკრეფავი სეზონზე · 15 იანვ. – 30 აპრ.

1. 21 სექტორის მენეჯერი: თითოეული მოიყვანს 10 მკრეფავს (≈210 კაცი)
2. ბონუსი მენეჯერს თითო მოყვანილ მკრეფავზე, მოტივაციისთვის
3. კონტაქტები მუნიციპალიტეტებში, სადაც ამ დროს სამუშაო არ არის (მაგ. შიდა ქართლი), და იქიდან მობილიზება
4. უცხოელი მუშახელის ჩამოყვანა
5. განთავსება: სახლების იჯარა სეზონის განმავლობაში

თებერვალი 2027

მკრეფავების მომზადება

მკრეფავების მოწვევა, მიმდინარე სამუშაოების ჩვენება და სიების გავლა

1 თებ. – 28 თებ.

მოსავალი / მკრეფავები

- მკრეფავების მოწვევა
- მიმდინარე მშენებლობის ჩვენება: რა იქნება სეზონისთვის
- სიების გადამოწმება

მარტი 2027

გაყიდვები

კონფერენცია შემსყიდველებისთვის: 2-დღიანი ტური საქართველოში

1 მარტ. – 31 მარტ.

გაყიდვები

- მოსაწვევი სია: პირდაპირი შემსყიდველები და ქსელების ხელმძღვანელები
- მოწვევის გაგზავნა და დადასტურება
- 2-დღიანი პროგრამა
- პლანტაციის, სამაცივრის და საწყობის დათვალიერება
- ტური საქართველოში
- ტრანსპორტი და სასტუმრო
- კომპანიის პრეზენტაცია
- შეხვედრების შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები

ტერიტორია



ადმინისტრაცია ჩრდილოეთით, გზიდან შესასვლელთან.

სამაცივრე (არსებული) ადმინისტრაციის სამხრეთ-დასავლეთით, ესტაკადით.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი ერთი გადახურვის ქვეშ, აუზის ზემოთ.

მოძრავი პუნქტები (4–5) პლანტაციაში, ნაკვეთებს შორის, გადაადგილდება სექტორებს შორის.

ბიოტუალეტები იჯარით, სეზონზე, სექტორებთან.

პლანტაცია აღმოსავლეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 21 სექტორი.

მოძრავი გადაფარებული პუნქტები



4–5 პუნქტი, ≈ 6 × 4 მ: სეზონური, ბორბლებზე, პლანტაციაში, ნაკვეთებს შორის.


ოპერატორი: კომპიუტერი და პრინტერი, აღრიცხვა AgroInTechSol-ში (სეკატორები, კრეფა QR-ით).

მაცივარი წყლისთვის.

გასაშლელი მაგიდები და სკამები შესვენებისა და სადილისთვის.

დენი: გენერატორი.

სამაცივრე და ესტაკადა

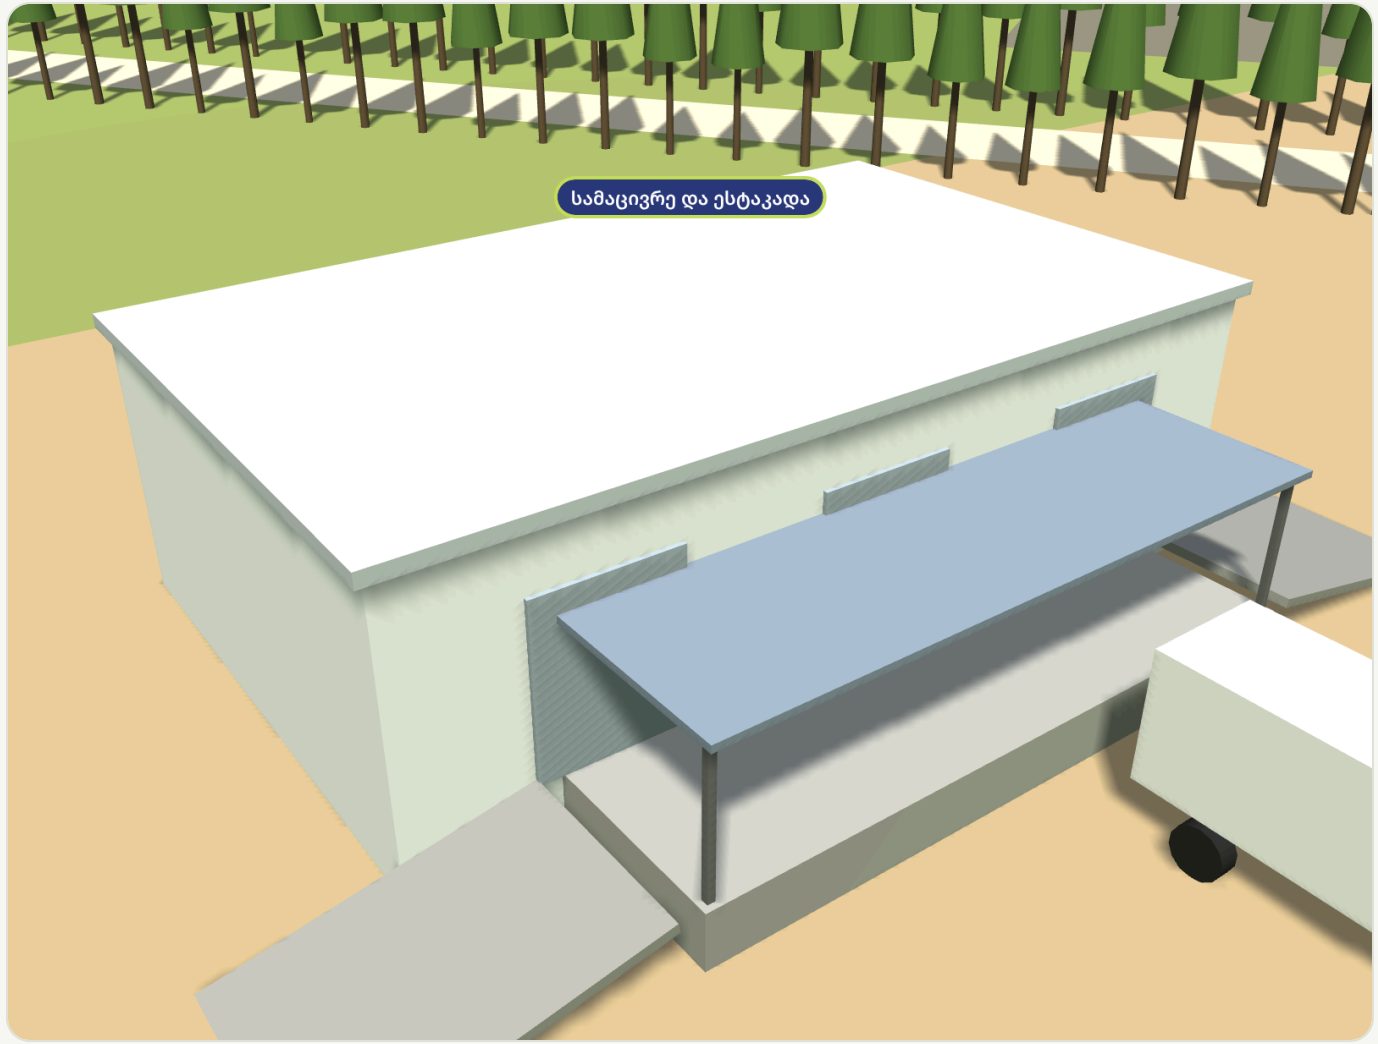

სამაცივრე უკვე დგას, მასში ინახება მოცვი.

ესტაკადა ≈ 12 × 4 მ: ბაქანი სატვირთოს ძარის სიმაღლეზე (1.2 მ), სახურავით.


პანდუსები ორივე ბოლოში: ერთზე ადიან, მეორეზე ჩამოდიან.

რეზინის ბამპერები, მოაჯირი, განათება.

პასუხისმგებელი: სამაცივრის პასუხისმგებელი პირი.

საწყობი და პრეპარატების ოთახი

ერთი გადახურვის ქვეშ

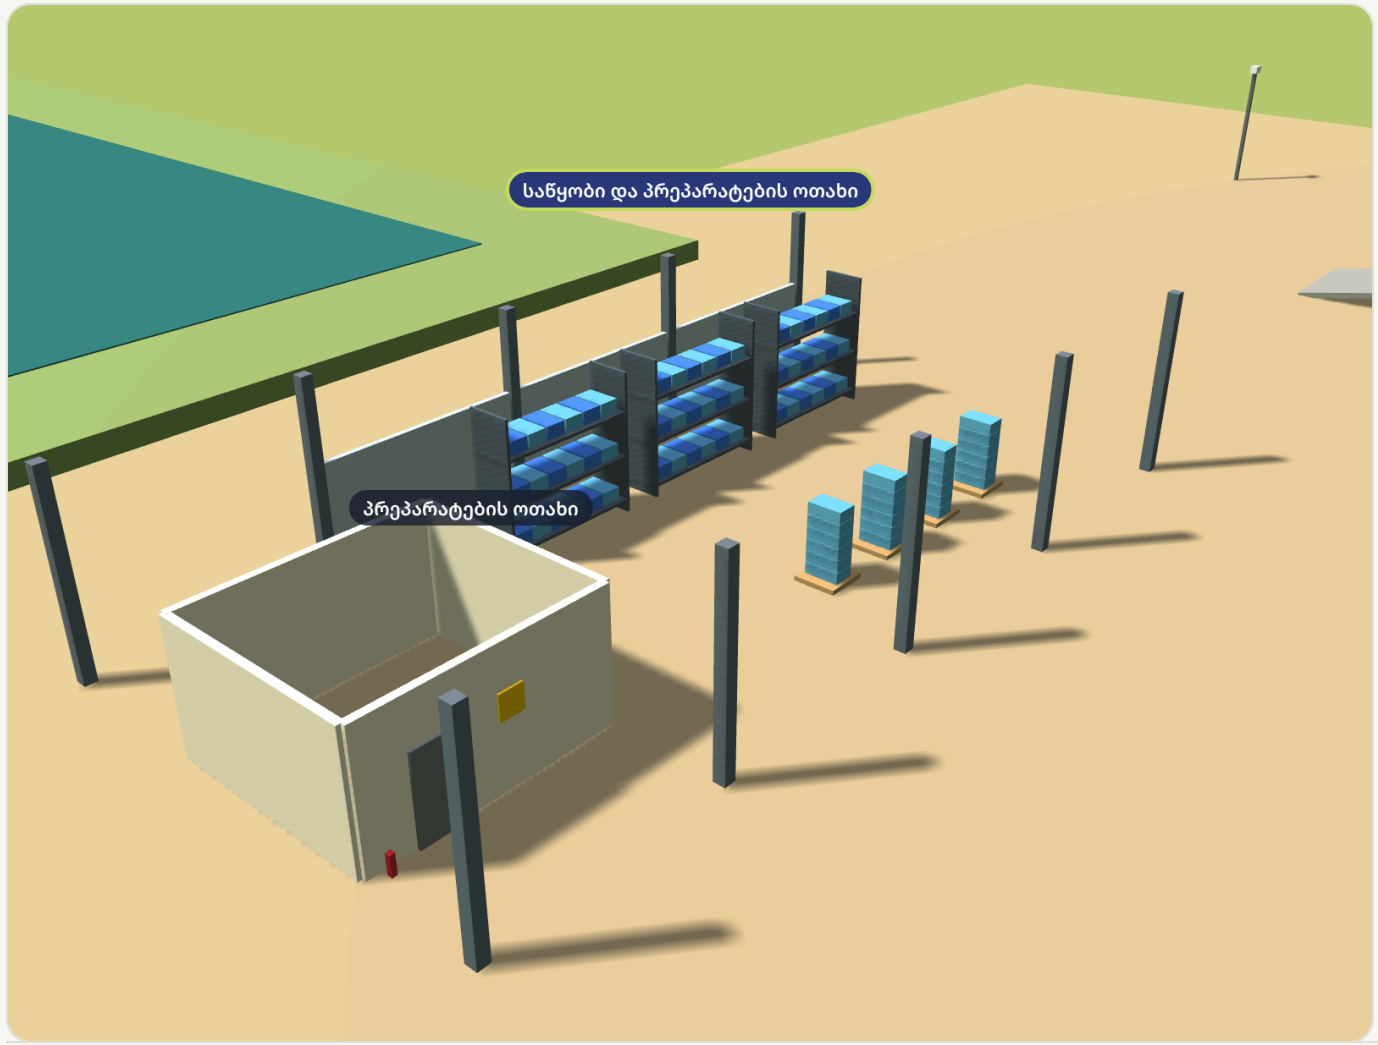

საწყობი ≈ 24 × 12 მ: ყუთები, პალეტები და ინვენტარი, მეტალის სტელაჟები 3 იარუსად.

პრეპარატების ოთახი ≈ 6 × 5 მ: ჩაკეტილი, ვენტილაციით.

ლითონის თაროები, ჩამოღვრის ტაფები, ცეცხლმაქრი, დაცვის საშუალებები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, თვალის სარეცხი.

პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი, შესვლა მხოლოდ პასუხისმგებელ პირს.

უნიფორმა

წინ ლოგო, უკან კომპანიის სახელი

ზაფხულის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ზამთრის მაისური



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ქურთუკი



წინ: ლოგო გულზე



უკან: კომპანიის სახელი

ფინანსები

ხელფასები	სეზონური ხარჯები	ერთჯერადი ხარჯები	გაყიდვები	სულ
—	—	—	—	—

მუხლი	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)	თვე	ჯამი
ხელფასები					—
აგრონომი		1	—	—	—
აგრონომის თანაშემწე		1	—	—	—
მთავარი ზედამხედველი მენეჯერი		1	—	—	—
სექტორის მენეჯერები		21	—	—	—
საველე კადრების მენეჯერი		1	—	—	—
საწყობის მენეჯერი		1	—	—	—
სამაცივრის პასუხისმგებელი		1	—	—	—
ადმინისტრატორი		1	—	—	—
დაცვა		—	—	—	—
ოპერატორები	მოძრავ პუნქტებზე	5	—	—	—

ფინანსები: ხარჯები

მუხლი	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)	თვე	ჯამი
სეზონური ხარჯები					—
მკრეფავების ანაზღაურება	კგ-ზე ან დღიურად	—	—	—	—
ბონუსი მენეჯერებს	თითო მოყვანილ მკრეფავზე	210	—	—	—
ბიოტუალეტების იჯარა	სეზონის განმავლობაში	—	—	—	—
სახლების იჯარა მკრეფავებისთვის	სეზონის განმავლობაში	—	—	—	—
უნიფორმა	ზაფხულის, ზამთრის, ქურთუკი	—	—	—	—
ტრენინგები	5 ტრენინგი	—	—	—	—
ერთჯერადი ხარჯები					—
საწყობი და პრეპარატების ოთახი		—	—	—	—
სამაცივრის ესტაკადა	პანდუსებით	—	—	—	—
მოძრავი გადაფარებული პუნქტები		5	—	—	—
ინვენტარი	ინვენტარის ცხრილიდან				—
გაყიდვები					—
შემსყიდველების კონფერენცია და ტური	მარტი, 2 დღე	—	—	—	—

ინვენტარი

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ფასი (₾)
სასწორები		—	—
სეკატორები (ფანცატურები)		—	—
კომპიუტერები		—	—
სამედიცინო ურნები		—	—
გენერატორები		—	—
ავეჯი		—	—
პირველადი დახმარების ყუთები	თითო ბრიგადაზე	8	—
წყლის მაცივარი	თითო პუნქტზე	5	—
პრინტერი	თითო პუნქტზე	5	—
გასაშლელი მაგიდები და სკამები	შესვენებისა და სადილისთვის	—	—

შესათანხმებელი

1. **გეგმა და ვადები:** ნოემბერი 2026 – აპრილი 2027.
2. **სტრუქტურა:** 21 სექტორის მენეჯერი და პასუხისმგებელი პირები.
3. **სეზონის პირობები:** მოძრავი პუნქტები (4–5), სამაცივრის ესტაკადა, საწყობი და პრეპარატების ოთახი, ბიოტუალეტების იჯარა.
4. **მკრეფავების სტრატეგია:** მენეჯერების ბონუსი, მუნიციპალიტეტები, უცხოელი მუშახელი, სახლების იჯარა.
5. **ფინანსები:** ხარჯების მუხლები და თანხები, 3 კომპანიის შეთავაზების შედარებით.
6. **მარტის კონფერენცია** შემსყიდველებისა და ქსელების ხელმძღვანელებისთვის.
